



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ
SECRETARIA DA FAZENDA
NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Gov. Estácio Coimbra N° 19 - Centro, CEP 55745-000 - Orobó - PE TEL.:
(81)3656-1156 CNPJ: 10.294.254/0001-13



Número da Nota:
00000420
Competência:
JAN/2024
Data e Hora Emissão:
04/01/2024 16:38:02
Código de Verificação:
M93E-M834H

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS: **EXIGÍVEL** Regime de Tributação: **NORMAL** Município de Incidência do ISS: **JOÃO ALFREDO - PE** Local da Prestação: **JOÃO ALFREDO - PE**
Número do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão do RPS: ISS Retido: **SIM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **20.935.844/0001-31** Inscrição Municipal: **2000242**
Nome/Razão Social: **M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- EPP**
Endereço: **STO LAUREANO, ZONA RURAL - OROBÓ. SN**
Município: **OROBÓ** UF: **PE** CEP: **55745000**
E-mail: **marcianolira@hotmail.com** TEL: **8136561110**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **30.754.400/0001-53** Inscrição Municipal: **—** Inscrição Estadual: **—**
Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO - PE**
Endereço: **RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA, SN BOA VISTA**
Município: **JOÃO ALFREDO** UF: **PE** CEP: **55720000**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. #QTD: 1 - V.UND.: R\$31.524,78 - TOTAL.: R\$31.524,78 - DED.: R\$18.914,87
SERVICOS DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE JOAO ALFREDO/PE, COFORME BOLETIM DE MEDICAO N 02.
MAO DE OBRA 40% - R\$ 12.609,91
MATERIAL 60% - 18.914,87
RETENCAO DE IMPOSTOS:
ISS - 5% SOBRE O VALOR DA MAO DE OBRA - R\$ 630,49
INSS - 11% SOBRE O VALOR DA MAO DE OBRA - R\$ 1.387,09
DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AG: 2369-8
CC: 19.391-7

Idney Kleiton Brito Dutra **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**
Secretário de Educação, Cultura e Esportes O material foi recebido em 04/01/2024
Matrícula: 9018 O serviço foi executado em 04/01/2024
[Assinatura]
Responsável pelo Recebimento

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 31.524,78

Atividade Prestada: **500382 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS** Código CNAE:
702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
29.507,19	18.914,87	12.609,91	5,00%	630,50
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	1.387,09	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções (R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.

71854627545547

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-orobo/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 008/2023 - FME	ORDEN DE SERVIÇO: 17/03/2023	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2024
LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA E RURAL - JOÃO ALFREDO / PE	CARTA CONVITE Nº: 004/2023 - FME	PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES	VALOR TOTAL DO BM: R\$ 31.524,78
EMPRESA CONTRATADA: MLIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATO Nº: 010/2023 - FME	PRAZO TRANSCORRIDO: 293 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 58.156,59
RESP. TÉCNICO: MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA - CREA RNP: 1821130170	VALOR DO CONTRATO: R\$ 174.248,27	PRAZO RESTANTE: 67 DIAS	% ACUMULADO: 33,38%
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20230971381	DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -	ADITIVO DE PRAZO: -	PERÍODO: 30/10/2023 A 04/01/2024
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20230930261	ADITIVO DE VALOR: -		DATA DE ELABORAÇÃO: 04/01/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 2ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.233,08		-		2.233,08		-
1.0.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	496,24	4,50	2.233,08	-	-	4,50	2.233,08	-	-
1.1	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PROCÓPIO CAVALCANTI				72.557,44		-		-		72.557,44
1.1.1	PINTURAS E ACABAMENTOS				72.557,44		-		-		72.557,44
1.1.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	17,47	2.775,66	48.490,78	-	-	-	-	2.775,66	48.490,78
1.1.1.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	22,29	669,44	14.921,81	-	-	-	-	669,44	14.921,81
1.1.1.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	11,57	352,24	4.075,41	-	-	-	-	352,24	4.075,41
1.1.1.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	55,43	61,20	3.392,31	-	-	-	-	61,20	3.392,31
1.1.1.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	19,22	87,26	1.677,13	-	-	-	-	87,26	1.677,13
1.2	ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA DE FARIAS - SÍTIO GANGUNGO				11.660,03		10.309,74		10.309,74		1.350,29
1.2.1	PINTURAS E ACABAMENTOS				11.660,03		10.309,74		10.309,74		1.350,29
1.2.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	17,47	605,14	10.571,79	590,14	10.309,74	590,14	10.309,74	15,00	262,05
1.2.1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	55,43	11,20	620,81	-	-	-	-	11,20	620,81
1.2.1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	19,22	24,32	467,43	-	-	-	-	24,32	467,43
1.3	ESCOLA MUNICIPAL VICENTE FERREIRA DAS GRAÇAS - SÍTIO PEDRA DO MANÇO				18.130,00		-		-		18.130,00

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 008/2023 - FME	ORDEM DE SERVIÇO: 17/03/2023	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2024
LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA E RURAL - JOÃO ALFREDO / PE	CARTA CONVITE Nº: 004/2023 - FME	PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES	VALOR TOTAL DO BM: R\$ 31.524,78
EMPRESA CONTRATADA: MLIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATO Nº: 010/2023 - FME	PRAZO TRANSCORRIDO: 293 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 58.156,59
RESP. TÉCNICO: MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA - CREA RNP: 1821130170	VALOR DO CONTRATO: R\$ 174.248,27	PRAZO RESTANTE: 67 DIAS	% ACUMULADO: 33,38%
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20230971381	DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -	ADITIVO DE PRAZO: -	PERÍODO: 30/10/2023 A 04/01/2024
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20230930261	ADITIVO DE VALOR: -		DATA DE ELABORAÇÃO: 04/01/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 2ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1.3.1	PINTURAS E ACABAMENTOS				18.130,00		-		-		18.130,00
1.3.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	17,47	857,67	14.983,49	-	-	-	-	857,67	14.983,49
1.3.1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	55,43	34,47	1.910,67	-	-	-	-	34,47	1.910,67
1.3.1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	19,22	64,30	1.235,84	-	-	-	-	64,30	1.235,84
1.4	ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALEXANDRE DA CRUZ - SÍTIO FUNDÃO				14.762,57		-		-		14.762,57
1.4.1	PINTURAS E ACABAMENTOS				14.762,57		-		-		14.762,57
1.4.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	17,47	746,82	13.046,94	-	-	-	-	746,82	13.046,94
1.4.1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	55,43	17,90	992,19	-	-	-	-	17,90	992,19
1.4.1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	19,22	37,64	723,44	-	-	-	-	37,64	723,44
1.5	ESCOLA MUNICIPAL RAUL SOARES - SÍTIO TAMANDUÁ				29.257,93		-		24.398,73		4.859,20
1.5.1	PINTURAS E ACABAMENTOS				29.257,93		-		24.398,73		4.859,20
1.5.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	17,47	1.276,93	22.307,96	-	-	1.021,14	17.839,31	255,79	4.468,65
1.5.1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	55,43	90,57	5.020,29	-	-	90,57	5.020,29	-	-
1.5.1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	19,22	100,40	1.929,68	-	-	80,08	1.539,13	20,32	390,55

[Assinatura]

[Assinatura]

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA E RURAL - JOÃO ALFREDO / PE EMPRESA CONTRATADA: MLIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI RESP. TÉCNICO: MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA - CREA RNP: 1821130170 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20230971381 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20230930261	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 008/2023 - FME CARTA CONVITE Nº: 004/2023 - FME CONTRATO Nº: 010/2023 - FME VALOR DO CONTRATO: R\$ 174.248,27 DATA DA REPROGRAMAÇÃO: - ADITIVO DE VALOR: -	ORDEM DE SERVIÇO: 17/03/2023 PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 293 DIAS PRAZO RESTANTE: 67 DIAS ADITIVO DE PRAZO: -	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2024 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 31.524,78 VALOR ACUMULADO: R\$ 58.156,59 % ACUMULADO: 33,38% PERÍODO: 30/10/2023 A 04/01/2024 DATA DE ELABORAÇÃO: 04/01/2024
---	--	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		2ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 2ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1.6	ESCOLA MUNICIPAL MÁRCIO XAVIER DE MOURA - BAIRRO ASA BRANCA				25.647,22		21.215,04		21.215,04		4.432,18
1.6.1	PINTURAS E ACABAMENTOS				25.647,22		21.215,04		21.215,04		4.432,18
1.6.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	17,47	1.214,37	21.215,04	1.214,37	21.215,04	1.214,37	21.215,04	-	-
1.6.1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	55,43	45,48	2.520,95	-	-	-	-	45,48	2.520,95
1.6.1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	19,22	99,44	1.911,23	-	-	-	-	99,44	1.911,23
TRINTA E UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS					174.248,27		31.524,78		58.156,59		116.091,68

Secretário de Educação

Idney Kleiton Brito Dutra

Secretário de Educação, Cultura e Esportes
Matrícula: 8018

ERISTHON HUGO GOMES DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 061898891-2

Responsável Técnico pela Medição

Responsável Técnico Contratada

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS
 LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA E RURAL - JOÃO ALFREDO / PE
 EMPRESA CONTRATADA: MLIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 RESP. TÉCNICO: MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA - CREA RNP: 1821130170
 DATA: 04/01/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.2	ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA DE FARIAS - SÍTIO GANGUNGO						
1.2.1	PINTURAS E ACABAMENTOS						
1.2.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2					
	Paredes						
	Sala 01	2,00			8,00	2,80	44,80
		2,00			6,00	3,33	39,96
	Sala 02	2,00			6,00	3,33	39,96
		2,00			8,00	2,80	44,80
	Cozinha				5,26	3,56	18,73
					5,26	2,63	13,83
		2,00			3,00	3,10	18,57
	Secretaria	2,00			4,50	2,64	23,76
		2,00			1,75	2,64	9,24
	WC Feminino	2,00			1,75	2,64	9,24
		2,00			1,60	2,64	8,45
	WC Masculino	2,00			1,75	2,64	9,24
		2,00			1,60	2,64	8,45
	Recreação				6,00	3,33	19,98
					2,70	2,63	7,10
					2,85	3,33	9,49
					14,90	3,56	53,04
					1,10	3,33	3,66
	Externo				8,00	2,64	21,12
					21,00	2,80	58,80
					21,00	4,50	94,50
					9,00	3,33	29,97
					9,00	4,33	38,97
	Descontos						
	Portões/Grades/Portas	-1,00	4,00			2,80	-11,20
		-4,00	0,90			2,10	-7,56
		-4,00	0,80			2,10	-6,72
		-4,00	0,60			2,10	-5,04
		-2,00	1,50			1,00	-3,00
		-2,00	1,00			1,00	-2,00
	Total item 1.2.1.1						590,14
1.6	ESCOLA MUNICIPAL MÁRCIO XAVIER DE MOURA - BAIRRO ASA BRANCA						
1.6.1	PINTURAS E ACABAMENTOS						
1.6.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2					
	Muro	2,00	26,43			1,70	89,86
			15,80			1,70	26,86
			9,80			0,85	8,33
			6,00			1,70	10,20
	Diretoria	2,00	3,60			2,67	19,22
		2,00	3,89			2,67	20,77
	Teto		3,60	3,89			14,00
	Descontos	-1,00	0,80			2,10	-1,68
		-1,00	1,50			1,20	-1,80
	Secretaria	2,00	6,30			2,80	35,28

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS
 LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA E RURAL - JOÃO ALFREDO / PE
 EMPRESA CONTRATADA: MLIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 RESP. TÉCNICO: MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA - CREA RNP: 1821130170
 DATA: 04/01/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
			2,00	5,00		2,80	28,00
	Teto			6,30	5,00		31,50
	Descontos		-2,00	0,80		2,10	-3,36
			-2,00	1,50		1,20	-3,60
	Almoxarifado		2,00	3,00		3,42	20,52
			2,00	1,95		3,42	13,34
	Teto			1,95	3,00		5,85
	Descontos		-1,00	0,80		2,10	-1,68
			-1,00	1,00		1,00	-1,00
	Sala dos Professores		2,00	5,20		2,60	27,04
			2,00	3,65		2,60	18,98
	Descontos		-1,00	0,80		2,10	-1,68
			-1,00	1,20		1,00	-1,20
			-1,00	1,50		1,00	-1,50
	Cantina			3,55		3,21	11,40
				3,55		3,00	10,65
				3,60		3,10	11,16
				3,60		3,10	11,16
	Descontos		-1,00	0,60		2,10	-1,26
			-1,00	0,87		3,60	-3,13
			-1,00	0,80		2,10	-1,68
			-1,00	1,60		0,46	-0,74
	Biblioteca		2,00	5,93		2,66	31,55
			2,00	5,20		2,66	27,66
	Descontos		-1,00	0,80		2,10	-1,68
	Sala 02		2,00	6,24		3,64	45,36
				5,18		2,88	14,92
				5,18		4,39	22,74
	Descontos		-1,00	1,50		1,00	-1,50
	Sala 03			5,24		3,43	17,97
				5,24		4,25	22,27
			2,00	6,20		3,84	47,62
	Descontos		-1,00	0,80		2,10	-1,68
			-3,00	1,50		1,00	-4,50
	Sala 04			6,00		4,14	24,84
				6,00		3,40	20,40
			2,00	4,80		3,77	36,19
	Descontos		-1,00	0,80		2,10	-1,68
			-2,00	1,50		1,00	-3,00
	Sala 05			4,11		2,93	12,04
				4,11		4,16	17,10
			2,00	7,80		3,55	55,30
	Descontos		-1,00	0,80		2,10	-1,68
			-2,00	1,50		1,00	-3,00
	Escada			1,10		2,27	2,50
				1,10		2,90	3,19
			2,00	5,00		3,64	36,35
	Descontos		-1,00	0,80		2,10	-1,68
	Sala 07 Pavimento 01			6,30		3,70	23,31
				6,30		3,60	22,68
			2,00	5,00		3,65	36,50
	Descontos		-1,00	0,80		2,10	-1,68
			-4,00	1,50		1,00	-6,00
	Recreação/Circuação			7,80		3,55	27,65
				3,89		3,55	13,79

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS
LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA E RURAL - JOÃO ALFREDO / PE
EMPRESA CONTRATADA: MLIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
RESP. TÉCNICO: MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA - CREA RNP: 1821130170
DATA: 04/01/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
				3,60		4,14	14,90
				16,43		4,40	72,29
				1,30		4,40	5,72
				8,00		4,16	33,28
				1,90		3,00	5,70
				1,30		3,00	3,90
				4,50		3,00	13,50
				1,30		3,00	3,90
	Descontos	-9,00	0,80			2,10	-15,12
		-1,00	1,50			1,00	-1,50
		-1,00	1,60			0,46	-0,74
		-3,00	0,60			2,10	-3,78
	Área Externa			2,40		3,40	8,16
				1,95		3,40	6,63
				7,85		7,00	54,95
				4,40		2,93	12,89
				3,00		3,40	10,20
				6,15		3,40	20,91
				4,80		3,40	16,32
				3,00		4,25	12,75
				6,20		4,25	26,35
	Descontos	-7,00	1,50			1,00	-10,50
	Total item 1.6.1.1						1.214,37

Idney Kleiton Brito Dutra
Secretário de Educação, Cultura e Esportes
Matrícula: 9018

ERISTHON HUGO GOMES DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 061898891-2

[Handwritten signature]

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS

**LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL MÁRCIO XAVIER DE MOURA – BAIRRO ASA BRANCA;
ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA DE FARIAS – SÍTIO CANGUNGO.**



FOTO 1: Pintura da escola municipal Márcio Xavier de Moura



FOTO 2: Pintura da escola municipal Márcio Xavier de Moura



FOTO 3: Pintura da escola municipal Márcio Xavier de Moura



FOTO 4: Pintura da escola municipal Márcio Xavier de Moura



FOTO 5: Pintura da escola municipal Márcio Xavier de Moura



FOTO 6: Pintura da escola municipal Márcio Xavier de Moura

MSA

[Assinatura]

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS

LOCAL: ESCOLA MUNICIPAL MÁRCIO XAVIER DE MOURA – BAIRRO ASA BRANCA;

ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA DE FARIAS – SÍTIO CANGUNGO.



FOTO 7: Pintura da escola municipal Severino Barbosa de Farias



FOTO 8: Pintura da escola municipal Severino Barbosa de Farias

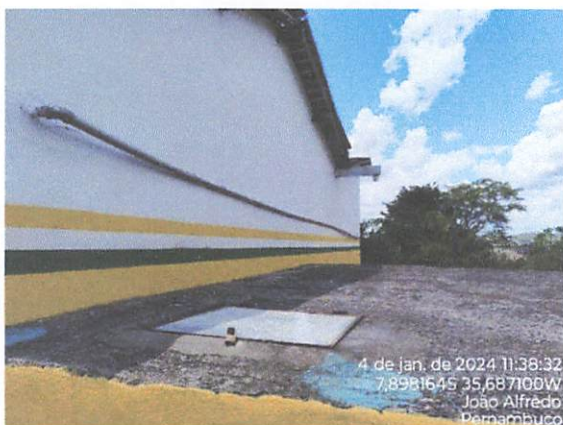


FOTO 9: Pintura da escola municipal Severino Barbosa de Farias



FOTO 10: Pintura da escola municipal Severino Barbosa de Farias

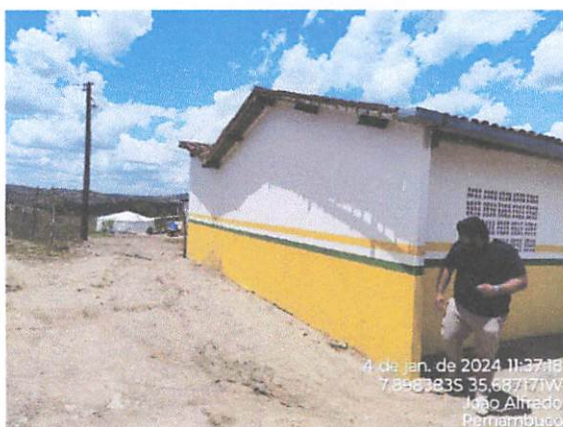


FOTO 11: Pintura da escola municipal Severino Barbosa de Farias



FOTO 12: Pintura da escola municipal Severino Barbosa de Farias

Handwritten signature



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M LIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.935.844/0001-31

Certidão nº: 48927235/2023

Expedição: 15/09/2023, às 14:55:52

Validade: 13/03/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M LIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 20.935.844/0001-31, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 20.935.844/0001-31
Razão Social: M LIRA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA EPP
Endereço: SIT LAUREANO SN / ZONA RURAL / OROBO / PE / 55745-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/12/2023 a 11/01/2024

Certificação Número: 2023121320332710700828

Informação obtida em 26/12/2023 10:42:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ

SECRETARIA DE FINANÇAS

PROCURADORIA JUDICIAL DO MUNICÍPIO

Endereço: AVN GOVERNADOR ESTÁCIO COIMBRA, nº 19-CENTRO Telefone: (81)3656-1156 CNPJ: 10.294.254/0001-13

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, em cumprimento ao despacho exarado no PROCESSO Nº 121/2023 e com base na legislação em vigor, que o contribuinte mencionado abaixo, está quite com os tributos do cadastro mercantil até a presente data: 13/12/2023

Contribuinte: M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- EPP		Inscrição Mercantil: 2000242 Sequencial:
Localização: STO LAUREANO, SN, ZONA RURAL - OROBÓ		Referência Loteamento:
Natureza: Tributos Mercantis		Cadastro Imobiliário:
Razão Social: M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- EPP		Inscrição Imobiliária:
CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
20.935.844/0001-31		2000242
Atividade Principal:		
500382 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
Atividades Secundárias		
4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS		
500569 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA		
500384 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS		
Início Atividade:	01/09/2014	Validade: 11/02/2024
Observações: Válido por 59 dias.		
 Assinatura(s) do(s) Responsável(is) PI		



Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

<https://gestor.tributosmunicipals.com.br/redesim/prefeitura/orobo/visualizar/publico/portaldodocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml>

7A5069778A937D79626FE6E0352A00C86BD39005



Pernambuco

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Número da Certidão: 2023.000010840426-30

Data de Emissão: 06/12/2023

DADOS DO REQUERENTE

CNPJ: 20.935.844/0001-31

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão, que o requerente acima identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado de Pernambuco.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida até **04/03/2024** devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL" na página www.sefaz.pe.gov.br.

Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado em Pernambuco.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: M LIRA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 20.935.844/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 16:04:00 do dia 06/11/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/05/2024.

Código de controle da certidão: **F4BB.91AF.D7CE.BF83**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
