



PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ
SECRETARIA DA FAZENDA
NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Av. Gov. Estácio Coimbra N° 19 - Centro, CEP 55745-000 - Orobó - PE TEL.:
(81)3656-1156 CNPJ: 10.294.254/0001-13



Número da Nota: **00000438**
Competência: **MAR/2024**
Data e Hora Emissão: **05/03/2024 11:45:07**
Código de Verificação: **AC7W-79TC4**

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS: **EXIGÍVEL** Regime de Tributação: **NORMAL** Município de Incidência do ISS: **JOÃO ALFREDO - PE** Local da Prestação: **JOÃO ALFREDO - PE**
Número do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão do RPS: ISS Retido: **SIM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **20.935.844/0001-31** Inscrição Municipal: **2000242**
Nome/Razão Social: **M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- EPP**
Endereço: **STO LAUREANO, ZONA RURAL - OROBÓ. SN**
Município: **OROBÓ** UF: **PE** CEP: **55745000**
E-mail: **marcianolira@hotmail.com** TEL: **8136561110**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **30.754.400/0001-53** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **---**
Nome/Razão Social: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO - PE**
Endereço: **RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA, SN BOA VISTA**
Município: **JOÃO ALFREDO** UF: **PE** CEP: **55720000**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. #QTD:1 - V.UND.:R\$57.940,40 - TOTAL.:R\$57.940,40 - DED.:R\$34.764,24
SERVIÇOS DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LOCALIZADAS NA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE JOAO ALFREDO/PE, COFORME BOLETIM DE MEDICAO N 03.
MAO DE OBRA 40% - R\$ 23.176,16
MATERIAL 60% - 34.764,24
RETENCAO DE IMPOSTOS:
ISS - 5% SOBRE O VALOR DA MAO DE OBRA - R\$ 1.158,81
INSS - 11% SOBRE O VALOR DA MAO DE OBRA - R\$ 2.549,38
IRPJ - 1,5% SOBRE O TOTAL DA NOTA - R\$ 869,11
DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AG:2369-8
CC: 19.391-7

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 57.940,40

Atividade Prestada: **500382 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS** Código CNAE:
702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
53.363,10	34.764,24	23.176,16	5,00%	1.158,81
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	2.549,38	0,00	0,00	869,11
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES5

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.
<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-orobo/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

2554657174593

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-orobo/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 008/2023 - FME	ORDEN DE SERVIÇO: 17/03/2023	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 002/2024
LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA E RURAL - JOÃO ALFREDO / PE	CARTA CONVITE Nº: 004/2023 - FME	PRazo DE EXECUÇÃO: 3 MESES	VALOR TOTAL DO BM: R\$ 57.940,40
EMPRESA CONTRATADA: MLIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATO Nº: 010/2023 - FME	PRazo TRANSCORRIDO: 353 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 116.096,99
RESP. TÉCNICO: MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA - CREA RNP: 182113017	VALOR DO CONTRATO: R\$ 174.248,27	PRazo RESTANTE: 7 DIAS	% ACUMULADO: 50,00%
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20230971381	DATA DA REPROGRAMAÇÃO: 19/02/2024	ADITIVO DE PRAZO: -	PERÍODO: 04/01/2024 A 04/03/2024
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20230930261	ADITIVO DE VALOR: R\$ 57.940,40 (33,25%)		DATA DE ELABORAÇÃO: 04/03/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA REPROGRAMADA		3ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 3ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				2.233,08		-		2.233,08		-
1.0.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	496,24	4,50	2.233,08	-	-	4,50	2.233,08	-	-
1.1	ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PROCÓPIO CAVALCANTI				72.557,44		-		-		72.557,44
1.1.1	PINTURAS E ACABAMENTOS				72.557,44		-		-		72.557,44
1.1.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	17,47	2.775,66	48.490,78	-	-	-	-	2.775,66	48.490,78
1.1.1.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	22,29	669,44	14.921,81	-	-	-	-	669,44	14.921,81
1.1.1.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM BORRACHA CLORADA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	11,57	352,24	4.075,41	-	-	-	-	352,24	4.075,41
1.1.1.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	55,43	61,20	3.392,31	-	-	-	-	61,20	3.392,31
1.1.1.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	19,22	87,26	1.677,13	-	-	-	-	87,26	1.677,13
1.2	ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO BARBOSA DE FARIAS - SÍTIO GANGUNGO				11.660,03		-		10.309,74		1.350,29
1.2.1	PINTURAS E ACABAMENTOS				11.660,03		-		10.309,74		1.350,29
1.2.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	17,47	605,14	10.571,79	-	-	590,14	10.309,74	15,00	262,05
1.2.1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	55,43	11,20	620,81	-	-	-	-	11,20	620,81
1.2.1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	19,22	24,32	467,43	-	-	-	-	24,32	467,43
1.3	ESCOLA MUNICIPAL VICENTE FERREIRA DAS GRAÇAS - SÍTIO PEDRA DO MANÇO				18.130,00		-				18.130,00
1.3.1	PINTURAS E ACABAMENTOS				18.130,00		-				18.130,00

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA E RURAL - JOÃO ALFREDO / PE EMPRESA CONTRATADA: MLIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI RESP. TÉCNICO: MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA - CREA RNP: 182113017 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20230971381 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20230930261	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 008/2023 - FME CARTA CONVITE Nº: 004/2023 - FME CONTRATO Nº: 010/2023 - FME VALOR DO CONTRATO: R\$ 174.248,27 DATA DA REPROGRAMAÇÃO: 19/02/2024 ADITIVO DE VALOR: R\$ 57.940,40 (33,25%)	ORDEM DE SERVIÇO: 17/03/2023 PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 353 DIAS PRAZO RESTANTE: 7 DIAS ADITIVO DE PRAZO: -	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 002/2024 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 57.940,40 VALOR ACUMULADO: R\$ 116.096,99 % ACUMULADO: 50,00% PERÍODO: 04/01/2024 A 04/03/2024 DATA DE ELABORAÇÃO: 04/03/2024
--	--	---	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA REPROGRAMADA		3ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 3ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1.3.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	17,47	857,67	14.983,49	-	-	-	-	857,67	14.983,49
1.3.1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	55,43	34,47	1.910,67	-	-	-	-	34,47	1.910,67
1.3.1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	19,22	64,30	1.235,84	-	-	-	-	64,30	1.235,84
1.4	ESCOLA MUNICIPAL SEVERINO ALEXANDRE DA CRUZ - SÍTIO FUNDÃO				14.762,57		-		-		14.762,57
1.4.1	PINTURAS E ACABAMENTOS				14.762,57		-		-		14.762,57
1.4.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	17,47	746,82	13.046,94	-	-	-	-	746,82	13.046,94
1.4.1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	55,43	17,90	992,19	-	-	-	-	17,90	992,19
1.4.1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	19,22	37,64	723,44	-	-	-	-	37,64	723,44
1.5	ESCOLA MUNICIPAL RAUL SOARES - SÍTIO TAMANDUÁ				29.257,93		-		24.398,73		4.859,20
1.5.1	PINTURAS E ACABAMENTOS				29.257,93		-		24.398,73		4.859,20
1.5.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	17,47	1.276,93	22.307,96	-	-	1.021,14	17.839,31	255,79	4.468,65
1.5.1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	55,43	90,57	5.020,29	-	-	90,57	5.020,29	-	-
1.5.1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	19,22	100,40	1.929,68	-	-	80,08	1.539,13	20,32	390,55
1.6	ESCOLA MUNICIPAL MÁRCIO XAVIER DE MOURA - BAIRRO ASA BRANCA				25.647,22		-		21.215,04		4.432,18

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 008/2023 - FME	ORDEM DE SERVIÇO: 17/03/2023	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 002/2024
LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA E RURAL - JOÃO ALFREDO / PE	CARTA CONVITE Nº: 004/2023 - FME	PRazo DE EXECUÇÃO: 3 MESES	VALOR TOTAL DO BM: R\$ 57.940,40
EMPRESA CONTRATADA: MLIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	CONTRATO Nº: 010/2023 - FME	PRazo TRANSCORRIDO: 353 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 116.096,99
RESP. TÉCNICO: MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA - CREA RNP: 1821130176	VALOR DO CONTRATO: R\$ 174.248,27	PRazo RESTANTE: 7 DIAS	% ACUMULADO: 50,00%
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20230971381	DATA DA REPROGRAMAÇÃO: 19/02/2024	ADITIVO DE PRAZO: -	PERÍODO: 04/01/2024 A 04/03/2024
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20230930261	ADITIVO DE VALOR: R\$ 57.940,40 (33,25%)		DATA DE ELABORAÇÃO: 04/03/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA REPROGRAMADA		3ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 3ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1.6.1	PINTURAS E ACABAMENTOS				25.647,22		-		21.215,04		4.432,18
1.6.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	17,47	1.214,37	21.215,04	-	-	1.214,37	21.215,04	-	-
1.6.1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	55,43	45,48	2.520,95	-	-	-	-	45,48	2.520,95
1.6.1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	19,22	99,44	1.911,23	-	-	-	-	99,44	1.911,23
1.7	ANEXO ESCOLA MUNICIPAL RAUL SOARES - SÍTIO LAJES				4.143,57		4.143,57		4.143,57		-
1.7.1	PINTURAS E ACABAMENTOS				4.143,57		4.143,57		4.143,57		-
1.7.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	17,47	180,42	3.151,93	180,42	3.151,93	180,42	3.151,93	-	-
1.7.1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	55,43	17,89	991,64	17,89	991,64	17,89	991,64	-	-
1.8	ESCOLA BENTO JERÔNIMO DA SILVA - SÍTIO OLHO D'ÁGUA CERCADO				35.683,94		35.683,94		35.683,94		-
1.8.1	PINTURAS E ACABAMENTOS				35.683,94		35.683,94		35.683,94		-
1.8.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	17,47	1.877,21	32.794,85	1.877,21	32.794,85	1.877,21	32.794,85	-	-
1.8.1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2	55,43	37,34	2.069,75	37,34	2.069,75	37,34	2.069,75	-	-
1.8.1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2	19,22	42,63	819,34	42,63	819,34	42,63	819,34	-	-
1.9	ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES A. OLIVEIRA - SÍTIO RIBEIRO GRANDE				8.199,72		8.199,72		8.199,72		-
1.9.1	PINTURAS E ACABAMENTOS				8.199,72		8.199,72		8.199,72		-

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA E RURAL - JOÃO ALFREDO / PE EMPRESA CONTRATADA: MLIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI RESP. TÉCNICO: MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA - CREA RNP: 1821130170 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20230971381 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20230930261	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 008/2023 - FME CARTA CONVITE Nº: 004/2023 - FME CONTRATO Nº: 010/2023 - FME VALOR DO CONTRATO: R\$ 174.248,27 DATA DA REPROGRAMAÇÃO: 19/02/2024 ADITIVO DE VALOR: R\$ 57.940,40 (33,25%)	ORDEM DE SERVIÇO: 17/03/2023 PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 353 DIAS PRAZO RESTANTE: 7 DIAS ADITIVO DE PRAZO: -	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 002/2024 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 57.940,40 VALOR ACUMULADO: R\$ 116.096,99 % ACUMULADO: 50,00% PERÍODO: 04/01/2024 A 04/03/2024 DATA DE ELABORAÇÃO: 04/03/2024
---	--	---	--

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA REPROGRAMADA		3ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 3ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1.9.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	17,47	348,77	6.093,01	348,77	6.093,01	348,77	6.093,01	-	-
1.9.1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	55,43	24,90	1.380,20	24,90	1.380,20	24,90	1.380,20	-	-
1.9.1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	19,22	37,80	726,51	37,80	726,51	37,80	726,51	-	-
1.10	ESCOLA MUNICIPAL SANTO OTACÍLIO - SÍTIO ROQUE				9.913,17		9.913,17		9.913,17		-
1.10.1	PINTURAS E ACABAMENTOS				9.913,17		9.913,17		9.913,17		-
1.10.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	17,47	511,12	8.929,26	511,12	8.929,26	511,12	8.929,26	-	-
1.10.1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	55,43	11,96	662,94	11,96	662,94	11,96	662,94	-	-
1.10.1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	19,22	16,70	320,97	16,70	320,97	16,70	320,97	-	-
CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS					232.188,67		57.940,40		116.096,99		116.091,68

Secretário de Educação

Erison Hugo Gomes da Silva
ERISTON HUGO GOMES DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 061898891-2

Responsável Técnico pela medição

Marciano Barbosa de Lira Silva
Responsável Técnico Contratada - EPP
MLIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA
DIRETOR / RESP TÉCNICO
TÉC EM EDIFICAÇÕES
ENG. CIVIL
CREA PE 1821130170

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS
 LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA E RURAL - JOÃO ALFREDO / PE
 EMPRESA CONTRATADA: MLIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 RESP. TÉCNICO: MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA - CREA RNP: 1821130170
 DATA: 04/03/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.7	ANEXO ESCOLA MUNICIPAL RAUL SOARES - SÍTIO LAJES						
1.7.1	PINTURAS E ACABAMENTOS						
1.7.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2					
	Pintura Interna						
	Sala de aula 01		2,00	5,00		1,32	13,20
			2,00	5,14		1,32	13,57
	Descontos		-2,00	1,00		0,95	-1,90
			-1,00	1,00		0,94	-0,94
	Sala de aula 02		2,00	3,85		1,32	10,16
			2,00	4,00		1,32	10,56
	Descontos		-2,00	1,10		0,95	-2,09
			-1,00	0,80		0,94	-0,75
	Sala de aula 03		2,00	3,85		1,32	10,16
			2,00	4,00		1,32	10,56
	Descontos		-2,00	1,10		0,95	-2,09
			-1,00	0,80		0,94	-0,75
	Recreação		1,00	1,20		0,95	1,14
			1,00	1,25		1,21	1,51
			1,00	4,03		1,32	5,32
			2,00	0,41		1,21	0,99
			2,00	1,89		1,32	4,99
			2,00	0,90		1,32	2,38
			2,00	8,00		1,32	21,12
	Descontos		-2,00	3,35		1,03	-6,90
			-1,00	4,80		0,99	-4,75
			-4,00	0,80		0,94	-3,01
			-3,00	0,80		0,94	-2,26
			-1,00	1,00		0,90	-0,90
			-1,00	0,50		0,50	-0,25
	Pintura Externa						
			2,00	5,44		3,11	33,87
			1,00	8,78		2,80	24,58
			1,00	3,15		2,80	8,82
			1,00	8,00		2,80	22,40
			2,00	2,48		2,80	13,89
	Descontos		-4,00	0,50		0,50	-1,00
			-1,00	1,10		1,10	-1,21
	Total item 1.7.1.1						180,42
1.7.1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2					
	Portões						
	G2		1,00	4,80		2,15	10,32
	Janelas						
	G1		2,00	3,35		1,13	7,57
	Total item 1.7.1.2						17,89
1.8	ESCOLA BENTO JERÔNIMO DA SILVA - SÍTIO OLHO D'ÁGUA						
1.8.1	CERCADO						
1.8.1	PINTURAS E ACABAMENTOS						

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS
 LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA E RURAL - JOÃO ALFREDO / PE
 EMPRESA CONTRATADA: MLIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 RESP. TÉCNICO: MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA - CREA RNP: 1821130170
 DATA: 04/03/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.8.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2					
	Pintura Interna						
	Secretaria		2,00	3,51		2,50	17,55
			2,00	5,33		2,50	26,65
	Descontos		-1,00	1,30		0,70	-0,91
			-1,00	0,80		2,10	-1,68
			-1,00	1,50		1,10	-1,65
	Diretoria		2,00	3,42		2,50	17,10
			2,00	5,37		2,50	26,85
	Descontos		-1,00	0,80		2,10	-1,68
			-1,00	1,50		1,10	-1,65
	Sala de aula 01		2,00	7,04		2,93	41,25
			2,00	5,37		3,19	34,22
	Descontos		-2,00	1,50		1,10	-3,30
			-1,00	1,60		0,80	-1,28
			-1,00	0,90		2,10	-1,89
	Sala de aula 02		1,00	7,06		3,64	25,70
			1,00	7,06		2,76	19,49
			2,00	4,95		3,20	31,68
	Descontos		-1,00	1,50		1,00	-1,50
			-1,00	1,60		0,80	-1,28
			-1,00	0,80		2,10	-1,68
	Biblioteca		1,00	9,31		2,76	25,70
			1,00	9,31		3,64	33,89
			2,00	4,98		3,20	31,87
	Descontos		-1,00	1,18		0,57	-0,67
			-1,00	1,54		0,93	-1,43
			-1,00	0,80		2,10	-1,68
	Sala de aula 10		2,00	3,41		2,37	16,16
			2,00	7,09		2,37	33,61
	Descontos		-1,00	1,50		1,00	-1,50
			-1,00	0,80		2,10	-1,68
	Sala de aula 09		2,00	3,44		2,37	16,31
			2,00	8,30		2,37	39,34
	Descontos		-3,00	1,50		1,00	-4,50
			-1,00	0,80		2,10	-1,68
	Sala de aula 07		1,00	5,96		3,14	18,68
			1,00	5,96		3,70	22,05
			1,00	7,60		3,50	26,58
			1,00	7,60		3,21	24,40
	Descontos		-2,00	1,23		0,80	-1,97
			-1,00	0,90		2,10	-1,89
	sala de aula 06		1,00	5,96		3,13	18,65
			1,00	5,96		3,60	21,46
			2,00	7,13		3,07	43,78
	Descontos		-2,00	1,23		0,80	-1,97
			-1,00	0,90		2,10	-1,89
	Sala de aula 05		1,00	7,00		3,48	24,36
			1,00	7,00		2,60	18,20
			2,00	5,04		3,04	30,64
	Descontos		-2,00	1,50		1,00	-3,00
			-1,00	0,90		2,10	-1,89
	Sala de aula 04		1,00	7,00		3,48	24,36
			1,00	7,00		2,60	18,20

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS
 LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA E RURAL - JOÃO ALFREDO / PE
 EMPRESA CONTRATADA: MLIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 RESP. TÉCNICO: MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA - CREA RNP: 1821130170
 DATA: 04/03/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
			2,00	5,03		3,04	30,58
	Descontos		-2,00	1,50		1,00	-3,00
			-1,00	0,90		2,10	-1,89
	Sala de aula 03		2,00	7,00		2,80	39,20
			2,00	6,25		3,08	38,46
	Descontos		-1,00	1,64		1,20	-1,97
			-1,00	0,80		2,10	-1,68
	Depósito 02		2,00	3,32		2,50	16,60
			2,00	4,68		2,50	23,40
			2,00	1,59		2,50	7,95
	Descontos		-1,00	1,00		1,00	-1,00
			-1,00	0,60		2,10	-1,26
			-1,00	0,90		2,10	-1,89
	Sala de aula 11		1,00	4,06		2,40	9,74
			1,00	4,06		2,80	11,37
	Descontos		-2,00	1,50		1,00	-3,00
			-1,00	0,80		2,10	-1,68
	Wc masculino		2,00	3,07		3,16	19,37
			2,00	2,50		2,80	14,00
			4,00	1,26		2,06	10,38
	Descontos		-2,00	0,60		1,60	-1,92
			-1,00	0,60		2,10	-1,26
			-2,00	1,55		0,55	-1,71
	Wc feminino		2,00	3,07		3,16	19,37
			2,00	2,50		2,80	14,00
			4,00	1,26		2,06	10,38
	Descontos		-2,00	0,60		1,60	-1,92
			-1,00	0,60		2,10	-1,26
			-2,00	1,55		0,55	-1,71
	Pátio 01		2,00	5,37		3,19	34,22
			1,00	5,00		2,93	14,65
			2,00	4,98		3,20	31,87
	Descontos		-1,00	0,90		2,10	-1,89
			-3,00	0,80		2,10	-5,04
	Pátio 02		1,00	2,78		2,80	7,78
			1,00	2,78		2,16	6,00
			1,00	5,27		2,48	13,07
			1,00	6,25		3,08	19,23
			1,00	6,14		3,08	18,89
	Descontos		-1,00	0,80		0,80	-0,64
			-2,00	0,80		2,10	-3,36
			-2,00	0,90		2,10	-3,78
	Pátio 03		1,00	9,31		2,16	20,11
			1,00	10,33		2,69	27,79
			2,00	2,00		2,16	8,64
			2,00	3,41		2,37	16,16
	Descontos		-1,00	1,18		0,57	-0,67
			-1,00	1,54		0,93	-1,43
			-1,00	1,50		1,00	-1,50
			-1,00	1,40		1,00	-1,40
			-1,00	0,90		2,10	-1,89
			-1,00	0,80		2,10	-1,68
	Circulação		1,00	3,90		2,70	10,53
			1,00	6,27		3,08	19,29
			1,00	7,60		3,05	23,15

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS
 LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA E RURAL - JOÃO ALFREDO / PE
 EMPRESA CONTRATADA: MLIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 RESP. TÉCNICO: MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA - CREA RNP: 1821130170
 DATA: 04/03/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
			1,00	1,94		3,31	6,41
			2,00	7,00		3,48	48,72
			1,00	10,00		3,13	31,30
			1,00	10,48		3,00	31,44
	Descontos		-2,00	3,18		3,13	-19,91
			-5,00	0,90		2,10	-9,45
	Recreação		1,00	5,49		3,13	17,18
			1,00	2,50		3,13	7,83
			1,00	4,50		3,14	14,13
			1,00	7,00		2,80	19,60
	Descontos		-1,00	1,93		1,00	-1,93
			-1,00	0,80		2,10	-1,68
	Ciculação de entrada		1,00	19,35		2,35	45,47
			1,00	19,35		3,55	68,69
			1,00	4,00		2,35	9,40
			1,00	4,00		2,80	11,20
	Descontos		-1,00	5,00		2,10	-10,50
			-4,00	1,50		1,10	-6,60
			-1,00	1,53		0,90	-1,38
			-1,00	2,50		2,21	-5,53
	Pintura Externa						
	Fachada		1,00	19,35		2,35	45,47
	Descontos		-1,00	2,50		2,21	-5,53
	Lateral direita		1,00	4,00		2,80	11,20
			1,00	5,67		3,19	18,07
			1,00	5,10		3,20	16,32
			1,00	5,27		2,48	13,07
			1,00	6,55		3,08	20,15
			1,00	9,65		2,96	28,56
	Descontos		-1,00	1,60		0,80	-1,28
			-1,00	1,50		1,00	-1,50
			-1,00	1,64		1,20	-1,97
	Posterior		1,00	28,85		2,60	75,01
	Descontos		-3,00	1,50		0,80	-3,60
			-4,00	1,50		1,00	-6,00
			-1,00	1,50		0,20	-0,30
	Lateral esquerda		1,00	4,00		2,35	9,40
			1,00	5,48		3,19	17,46
			1,00	8,30		4,07	33,78
			1,00	8,60		2,50	21,50
			1,00	3,90		2,69	10,49
			1,00	7,90		3,07	24,28
			1,00	7,28		3,07	22,35
	Descontos		-1,00	1,53		0,90	-1,38
			-1,00	1,30		0,70	-0,91
			-3,00	1,50		1,00	-4,50
			-5,00	1,23		0,80	-4,92
	Teto						
	Diretoria		1,00	5,37	3,42		18,37
	Secretaria		1,00	5,33	3,51		18,71
	Sala de aula 10		1,00	7,09	3,41		24,18
	Sala de aula 09		1,00	8,30	3,44		28,55
	Cozinha		1,00	5,49	5,02		27,56
	Total item 1.8.1.1						1.877,21

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS
 LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA E RURAL - JOÃO ALFREDO / PE
 EMPRESA CONTRATADA: MLIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 RESP. TÉCNICO: MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA - CREA RNP: 1821130170
 DATA: 04/03/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.8.1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2					
	Portão		1,00	2,50		2,21	5,53
			1,00	5,00		2,10	10,50
	Janelas		3,00	1,50		0,80	3,60
			4,00	1,50		1,00	6,00
			5,00	1,23		0,80	4,92
			3,00	1,50		1,00	4,50
			1,00	1,30		0,70	0,91
			1,00	1,53		0,90	1,38
	Total item 1.8.1.2						37,34
1.8.1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	M2					
	P1		7,00	0,60		2,10	8,82
	P2		10,00	0,80		2,10	16,80
	P3		9,00	0,90		2,10	17,01
	Total item 1.8.1.3						42,63
1.9	ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES A. OLIVEIRA - SÍTIO RIBEIRO GRANDE						
1.9.1	PINTURAS E ACABAMENTOS						
1.9.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2					
	Paredes Longitudinais						
			2,00	3,30		2,80	18,48
			4,00	12,45		2,80	139,44
			2,00	5,40		3,20	34,56
			2,00	3,00		2,00	12,00
			2,00	2,35		3,20	15,04
	Paredes Transversais						0,00
			2,00	17,00		2,80	95,20
			2,00	12,35		2,80	69,16
			2,00	4,50		2,00	18,00
			2,00	2,20		2,80	12,32
			2,00	4,50		2,80	25,20
	Muro						0,00
			2,00	17,00		1,10	37,40
			4,00	4,80		1,10	21,12
	Descontos da Esquadrias 2x		-1,00	87,60			-87,60
	Descontos de trechos não executados		85%	410,32			348,77
	Total item 1.9.1.1						348,77
1.9.1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020	M2					
	Portões/Grades			5,40		2,40	12,96
				1,80		2,10	3,78
				3,40		2,40	8,16
	Total item 1.9.1.2						24,90

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS
 LOCALIZAÇÃO: ZONA URBANA E RURAL - JOÃO ALFREDO / PE
 EMPRESA CONTRATADA: MLIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
 RESP. TÉCNICO: MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA - CREA RNP: 1821130170
 DATA: 04/03/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.9.1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2					
			3,00	0,60		2,10	3,78
			3,00	0,80		2,10	5,04
			7,00	1,20		1,20	10,08
	2x Área		2,00	18,90			37,80
	Total item 1.9.1.3						37,80
1.10	ESCOLA MUNICIPAL SANTO OTACÍLIO - SÍTIO ROQUE						
1.10.1	PINTURAS E ACABAMENTOS						
1.10.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2					
	Sala 01		2,00		5,30	3,18	33,66
			2,00		6,20	2,70	33,48
	Sala 02		2,00		5,30	3,18	33,66
			2,00		6,20	2,70	33,48
	Sala 03		2,00		5,30	3,18	33,66
			2,00		6,20	2,70	33,48
	Cozinha		2,00		2,80	1,30	7,28
			2,00		4,20	1,30	10,92
	Dispensa		2,00		2,80	3,18	17,78
			2,00		2,00	2,70	10,80
	WC Masc		2,00		1,10	1,70	3,74
			2,00		2,00	1,70	6,80
	WC Fem		2,00		1,10	1,70	3,74
			2,00		2,00	1,70	6,80
	Recreação		1,00		4,60	2,75	12,65
			1,00		4,20	3,60	15,12
			1,00		8,40	3,18	26,67
			1,00		10,75	3,18	34,13
	Externo		2,00		10,75	3,18	68,26
			2,00		17,90	3,18	113,67
	Descontos da Esquadrias e Aberturas		-1,00	28,66			-28,66
	Total item 1.10.1.1						511,12
1.10.1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2					
	Portões/Grades				4,60	2,60	11,96
	Total item 1.10.1.2						11,96
1.10.1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2					
	Portas		1,00		0,90	2,10	1,89
			3,00		0,60	2,10	3,78
			1,00		0,80	2,10	1,68
					1,00	1,00	1,00
	2x Área		2,00	8,35			16,70
	Total item 1.10.1.3						16,70

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS



FOTO 1: Pintura da escola municipal Bento Jerônimo da Silva



FOTO 2: Pintura da escola municipal Bento Jerônimo da Silva



FOTO 3: Pintura da escola municipal Bento Jerônimo da Silva



FOTO 4: Pintura da escola municipal Bento Jerônimo da Silva



FOTO 5: Pintura da escola municipal Bento Jerônimo da Silva



FOTO 6: Pintura da escola municipal Bento Jerônimo da Silva



DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS



FOTO 7: Pintura da escola municipal Bento Jerônimo da Silva



FOTO 8: Pintura da escola municipal Bento Jerônimo da Silva



FOTO 9: Pintura da escola municipal Bento Jerônimo da Silva



FOTO 10: Pintura da escola municipal Bento Jerônimo da Silva



FOTO 11: Pintura da escola municipal Bento Jerônimo da Silva



FOTO 12: Pintura da escola municipal Bento Jerônimo da Silva

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS



FOTO 13: Pintura da escola municipal Maria de Lourdes A. Oliveira



FOTO 14: Pintura da escola municipal Maria de Lourdes A. Oliveira



FOTO 15: Pintura da escola municipal Maria de Lourdes A. Oliveira



FOTO 16: Pintura da escola municipal Maria de Lourdes A. Oliveira



FOTO 17: Pintura da escola municipal Maria de Lourdes A. Oliveira



FOTO 18: Pintura da escola municipal Maria de Lourdes A. Oliveira

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS



FOTO 19: Pintura da escola municipal Maria de Lourdes A. Oliveira



FOTO 20: Pintura da escola municipal Maria de Lourdes A. Oliveira



FOTO 21: Pintura da escola municipal Maria de Lourdes A. Oliveira



FOTO 22: Pintura da escola municipal Maria de Lourdes A. Oliveira



FOTO 23: Pintura da escola municipal Maria de Lourdes A. Oliveira



FOTO 24: Pintura da escola municipal Maria de Lourdes A. Oliveira

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS



FOTO 25: Pintura da escola municipal Raul Soares



FOTO 26: Pintura da escola municipal Raul Soares



FOTO 27: Pintura da escola municipal Raul Soares



FOTO 28: Pintura da escola municipal Raul Soares



FOTO 29: Pintura da escola municipal Raul Soares



FOTO 30: Pintura da escola municipal Raul Soares

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS



FOTO 31: Pintura da escola municipal Raul Soares



FOTO 32: Pintura da escola municipal Raul Soares



FOTO 33: Pintura da escola municipal Raul Soares



FOTO 34: Pintura da escola municipal Raul Soares



FOTO 35: Pintura da escola municipal Raul Soares



FOTO 36: Pintura da escola municipal Raul Soares

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS



FOTO 37: Pintura da escola municipal Santo Otacílio



FOTO 38: Pintura da escola municipal Santo Otacílio



FOTO 39: Pintura da escola municipal Santo Otacílio



FOTO 40: Pintura da escola municipal Santo Otacílio



FOTO 41: Pintura da escola municipal Santo Otacílio

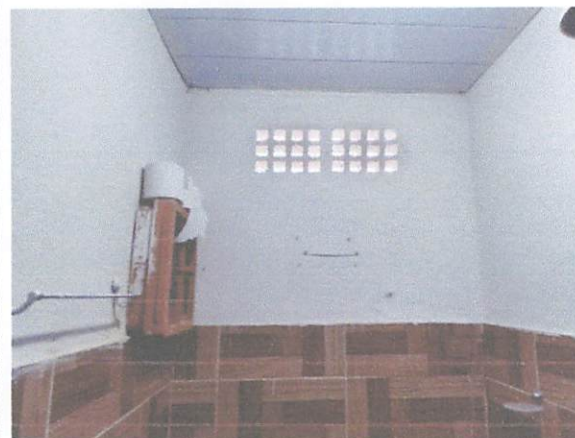


FOTO 42: Pintura da escola municipal Santo Otacílio

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA – 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS



FOTO 43: Pintura da escola municipal Santo Otacílio



FOTO 44: Pintura da escola municipal Santo Otacílio



FOTO 45: Pintura da escola municipal Santo Otacílio



FOTO 46: Pintura da escola municipal Santo Otacílio

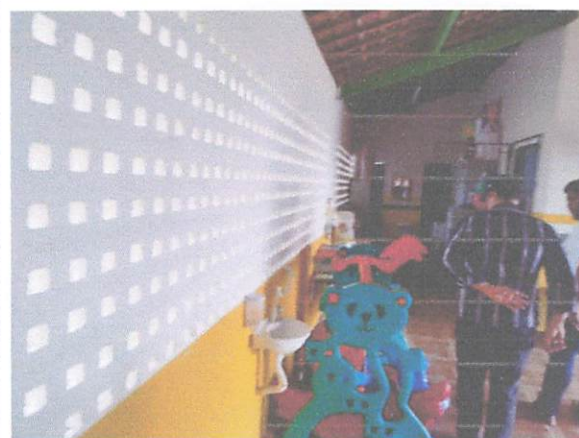


FOTO 47: Pintura da escola municipal Santo Otacílio



FOTO 48: Pintura da escola municipal Santo Otacílio
