

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 004/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 28/02/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2025
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE	DISPENSA Nº: 003/2025	PRazo DE EXECUÇÃO: 3 MESES	VALOR TOTAL DO BDI: R\$ 10.278,01
EMPRESA CONTRATADA: M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP / CNPJ 18.211.130/0001-70	CONTRATO Nº: 006/2025	PRazo TRANSCORRIDO: 34 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 10.278,01
RESP. TÉCNICO: MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA - CREA RNP: 1821130170	VALOR DO CONTRATO: R\$ 79.406,64	PRazo RESTANTE: 56 DIAS	% ACUMULADO: 12,94%
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20251303567	DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -	ADITIVO DE PRAZO: -	PERÍODO: 28/02/2025 A 03/04/2025
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251268608	ADITIVO DE VALOR: -		DATA DE ELABORAÇÃO: 03/04/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM	2.446,33	1,00	2.446,33	0,09	220,16	0,09	220,16	0,91	2.226,17
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.0.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	571,99	4,50	2.573,95	4,50	2.573,95	4,50	2.573,95	-	-
1.1	CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
1.1.1	PINTURAS E ACABAMENTOS										
1.1.1.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	M2	14,46	327,50	4.735,65	-	-	-	-	327,50	4.735,65
1.1.1.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	M2	16,79	80,39	1.349,74	-	-	-	-	80,39	1.349,74
1.1.1.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO). AF_01/2020	M2	53,86	47,45	2.555,65	-	-	-	-	47,45	2.555,65
1.1.1.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃO. AF_01/2021	M2	18,13	29,84	540,99	-	-	-	-	29,84	540,99
1.2	CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL										
1.2.1	PINTURAS E ACABAMENTOS										
1.2.1.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	M2	14,46	573,02	8.285,86	-	-	-	-	573,02	8.285,86
1.2.1.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO). AF_01/2020	M2	53,86	20,43	1.100,35	-	-	-	-	20,43	1.100,35
1.2.1.3	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃO. AF_01/2021	M2	18,13	41,08	744,78	-	-	-	-	41,08	744,78
1.3	CONSELHO TITULAR										
1.3.1	PINTURAS E ACABAMENTOS										
					7.064,77		-		-		7.064,77

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - JOÃO ALFREDO / PE	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 004/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO:	001/2025
EMPRESA CONTRATADA: M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP / CNPJ 18.211.301/70-00	DISPENSA Nº: 003/2025	VALOR TOTAL DO B.M:	R\$ 10.278,01
RESP. TÉCNICO: MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA - CREA RNP: 1821130170-00	CONTRATO Nº: 006/2025	VALOR ACUMULADO:	R\$ 10.278,01
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20251303567	VALOR DO CONTRATO: R\$ 79.406,64	% ACUMULADO:	12,94%
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251268608	DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -	PERÍODO: 28/02/2025 A 03/04/2025	
	ADITIVO DE VALOR: -	DATA DE ELABORAÇÃO:	03/04/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1.3.1.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	M2	14,46	296,31	4.284,64	-	-	-	-	296,31	4.284,64
1.3.1.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	M2	16,79	76,70	1.287,79	-	-	-	-	76,70	1.287,79
1.3.1.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO. AF_01/2020)	M2	53,86	17,32	932,85	-	-	-	-	17,32	932,85
1.3.1.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃO. AF_01/2021	M2	18,13	30,86	559,49	-	-	-	-	30,86	559,49
1.4	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS										
1.4.1	PINTURAS E ACABAMENTOS				25.148,70		-		-		25.148,70
1.4.1.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	M2	14,46	939,73	13.588,49	-	-	-	-	939,73	13.588,49
1.4.1.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	M2	16,79	314,58	5.281,79	-	-	-	-	314,58	5.281,79
1.4.1.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO. AF_01/2020)	M2	53,86	9,31	501,43	-	-	-	-	9,31	501,43
1.4.1.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃO. AF_01/2021	M2	18,13	173,78	3.150,63	-	-	-	-	173,78	3.150,63
1.4.1.5	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃO. AF_01/2021	M2	23,85	110,12	2.626,36	-	-	-	-	110,12	2.626,36
1.5	COZINHA COMUNITÁRIA MARIA LUCINDA										
1.5.1	PINTURAS E ACABAMENTOS				5.863,12		-		-		5.863,12
1.5.1.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	M2	14,46	190,02	2.747,68	-	-	-	-	190,02	2.747,68
1.5.1.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	M2	16,79	133,29	2.237,93	-	-	-	-	133,29	2.237,93

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - JOÃO ALFREDO / PE		PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 004/2025		ORDEM DE SERVIÇO: 28/02/2025		BOLETIM DE MEDIÇÃO:	
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE		DISPENSA Nº: 003/2025		PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES		VALOR TOTAL DO BM:	
EMPRESA CONTRATADA: M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP / CNPJ 18.211.301/71-0001		CONTRATO Nº: 006/2025		PRAZO REstante: 56 DIAS		VALOR ACUMULADO:	
RESP. TÉCNICO: MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA - CREA RNP: 18.211.301/71-0001		VALOR DO CONTRATO: R\$ 79.406,64		ADITIVO DE PRAZO: -		% ACUMULADO:	
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20251303567		DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -		ADITIVO DE VALOR: -		PERÍODO: 28/02/2025 A 03/04/2025	
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251268608		ADITIVO DE VALOR: -		DATA DE ELABORAÇÃO: 03/04/2025			
ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA	1ª MEDIÇÃO	ACUMULADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO	SALDO
				QUANT. V. TOTAL	QUANT. V. TOTAL	QUANT. V. TOTAL	QUANT. V. TOTAL
1.5.1.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	53,86	5,76 310,23	- -	- -	5,76 310,23
1.5.1.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	18,13	31,29 567,28	- -	- -	31,29 567,28
1.6	CENTRO DE CONVIVÊNCIA URBANO						
1.6.1	PINTURAS E ACABAMENTOS						
1.6.1.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	14,46	300,11 4.339,59	- -	- -	300,11 4.339,59
1.6.1.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	16,79	152,52 2.560,81	- -	- -	152,52 2.560,81
1.6.1.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	53,86	24,45 1.316,87	- -	- -	24,45 1.316,87
1.6.1.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	18,13	13,24 240,04	- -	- -	13,24 240,04
1.7	CENTRO DE CONVIVÊNCIA URBANO - POVOADO DE BREJINHOS						
1.7.1	PINTURAS E ACABAMENTOS						
1.7.1.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	14,46	443,12 6.407,51	443,12 6.407,51	443,12 6.407,51	- -
1.7.1.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	16,79	12,97 217,76	12,97 217,76	12,97 217,76	- -
1.7.1.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	53,86	24,45 1.316,87	10,59 570,37	10,59 570,37	13,86 746,50
1.7.1.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	18,13	32,78 594,30	15,90 288,26	15,90 288,26	16,88 306,04
	DEZ MIL, DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E UM CENTAVO			79.403,64	10.278,01	10.278,01	69.125,63

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - JOÃO ALFREDO / PE	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 004/2025	ORDEM DE SERVIÇO: 28/02/2025	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 001/2025
EMPRESA CONTRATADA: M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP / CNPJ: 06.908.648/0001-08	DISPENSA Nº: 003/2025	PRazo DE EXECUÇÃO: 3 MESES	VALOR TOTAL DO BM: R\$ 10.278,01
RESP. TÉCNICO: MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA - CREA RNP: 1821130170	CONTRATO Nº: 006/2025	PRazo TRANSCORRIDO: 34 DIAS	VALOR ACUMULADO: R\$ 10.278,01
ART DE EXECUÇÃO Nº PE20251303567	VALOR DO CONTRATO: R\$ 79.406,64	PRazo RESTANTE: 56 DIAS	% ACUMULADO: 12,94%
ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251268608	DATA DA REPROGRAMAÇÃO: -	ADITIVO DE PRAZO: -	PERÍODO: 28/02/2025 A 03/04/2025
	ADITIVO DE VALOR: -		DATA DE ELABORAÇÃO: 03/04/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	PLANILHA CONTRATADA		1ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 1ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL


Herlton Adanylis Martins Rufino
Secretário de Infraestrutura, Meio Ambiente e Projetos Especiais
Matrícula: 7696


ERISTON HUGO GOMES DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 0888985-2

Responsável Técnico pela Medição


Responsável Técnico Contratada
MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA
DIRETOR / RESP TÉCNICO
TÉC. EM EDIFICAÇÕES
ENG. CIVIL
CREA/PE 1821130170

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE
 EMPRESA CONTRATADA: M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP / CNPJ: 20.935.844/0001-31
 RESP. TÉCNICO: MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA - CREA RNP: 1821130170
 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20251303567
 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251268608
 DATA: 03/04/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
1.0.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UM	%	Total			
	Evolução da obra %		9,43%	1,00			0,09
	Total item 1.0.1						0,09
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.0.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2					
	Placa de Obra			3,00		1,50	4,50
	Total item 1.0.1						4,50
1.7	CENTRO DE CONVIVÊNCIA URBANO - POVOADO DE BREJINHOS						
1.7.1	PINTURAS E ACABAMENTOS						
1.7.1.1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2					
	Pintura Interna						
	Hall		2,00		2,81	2,10	11,80
			2,00	2,76		2,10	11,59
	Desconto Portas e Janelas		-1,00		1,85	1,98	-3,66
			-1,00		0,72	1,81	-1,30
			-1,00		0,80	2,10	-1,68
	Recepção						
	Parede lateral direita			2,68		3,40	9,11
	Parede lateral esquerda			2,68		2,20	5,90
	Parede frontal				2,66	2,86	7,61
	Parede posterior				2,66	2,10	5,59
	Desconto Portas e Janelas		-1,00		0,72	1,81	-1,30
			-1,00		1,00	0,93	-0,93
			-1,00		1,52	1,81	-2,75
	CIR		2,00	2,86		2,10	12,01
			2,00		2,67	2,10	11,21
	Desconto Portas e Janelas		-1,00		0,68	1,81	-1,23
			-1,00		1,52	1,81	-2,75

Hérllon Adamylls Mariano Ramos
 Secretário de Infraestrutura, Meio Ambiente e Projetos Especiais
 Matrícula: 7696

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE
 EMPRESA CONTRATADA: M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP / CNPJ: 20.935.844/0001-31
 RESP. TÉCNICO: MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA - CREA RNP: 1821130170
 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20251303567
 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251268608
 DATA: 03/04/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
			-1,00		0,56	0,90	-0,50
			-1,00		0,67	1,81	-1,21
	Atendimento	2,00			2,81	2,10	11,80
		2,00		2,88		2,10	12,10
					1,48	1,20	1,78
	Desconto Portas e Janelas	-1,00			0,68	1,81	-1,23
		-1,00			0,60	0,77	-0,46
	Copa	2,00		2,74		2,10	11,51
		2,00			2,67	2,10	11,21
					1,34	1,20	1,60
	Desconto Portas e Janelas	-1,00			0,67	1,81	-1,21
		-1,00			0,66	1,81	-1,19
		-1,00			0,72	1,81	-1,30
	Sala RG	2,00		2,70		2,10	11,34
		2,00			2,80	2,10	11,76
					1,40	1,20	1,68
	Desconto Portas e Janelas	-1,00			0,66	1,81	-1,19
		-1,00			0,60	0,76	-0,46
	Salão	2,00		8,61		2,40	41,33
		2,00			3,87	2,40	18,58
	Desconto Portas e Janelas	-1,00			0,76	1,80	-1,37
		-1,00			0,57	0,93	-0,53
		-1,00			0,88	2,06	-1,81
	Cozinha Comunitária 1	2,00			3,16	2,02	12,77
		2,00		2,42		2,02	9,78
		2,00			3,04	2,72	16,51
	Desconto Portas e Janelas	-1,00			1,00	1,00	-1,00
		-1,00			0,80	2,10	-1,68
		-1,00			1,00	0,44	-0,44
	Cozinha Comunitária 2	2,00			2,95	0,66	3,89
		2,00		5,36		0,66	7,08
	bancadas	2,00			0,89	0,75	1,34
		4,00		0,59		0,75	1,77
				1,00		0,75	0,75
		2,00			0,53	0,75	0,80
				1,80		0,75	1,35
		2,00			0,44	0,75	0,66
	Desconto Portas e Janelas	-2,00			0,60	0,40	-0,48
		-1,00			0,80	0,66	-0,53

Hérllon Adamylls Mariano Ramos
 Secretário de Infraestrutura, Meio Ambiente e Projetos Especiais
 Matrícula: 7696

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE

EMPRESA CONTRATADA: M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP / CNPJ: 20.935.844/0001-31

RESP. TÉCNICO: MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA - CREA RNP: 1821130170

ART DE EXECUÇÃO Nº PE20251303567

ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251268608

DATA: 03/04/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
			-1,00		0,80	0,63	-0,50
	Cozinha Comunitária 3		2,00		3,17	2,01	12,74
			2,00	1,98		2,01	7,96
	Desconto Portas e Janelas		-1,00		0,80	2,00	-1,60
	WC		2,00		1,14	2,20	5,02
			2,00	1,32		2,20	5,81
	desconto abertura		-1,00		0,60	2,00	-1,20
	Depósito						
	parede frontal				1,33	2,06	2,74
	lavatório		3,00		0,56	0,86	1,44
	parede lateral esquerda			4,42		1,84	8,13
	Desconto porta		-1,00		0,46	1,44	-0,66
	Desconto cerâmica		-1,00	1,92		1,53	-2,94
	parede externa 1		2,00	2,06		1,00	4,12
	parede externa 2		2,00	2,36		0,92	4,34
	parede fundo				1,18	1,69	1,99
	Pintura Externa						
	Fachada Frontal				14,61	2,91	42,57
	Desconto Portas e Janelas		-1,00		1,85	1,98	-3,66
			-1,00		1,00	1,00	-1,00
			-1,00		1,00	0,93	-0,93
			-1,00		0,80	2,11	-1,69
	Muro da frente				10,33	0,91	9,40
					7,37	1,56	11,50
	Galinheiro				0,32	2,21	0,71
				3,73		1,10	4,10
	Pilar Frontal 1		4,00		0,22	2,34	2,06
	Pilar Frontal 2		4,00		0,08	2,34	0,75
	Pilar Frontal 3		4,00		0,14	2,20	1,23
	Pilar Frontal 4		4,00		0,13	2,12	1,10
	Pilar Frontal 5		4,00		0,08	1,65	0,53
	Mureta			4,84		0,70	3,39
	Assento Mureta			4,84	0,47		2,27
	Escada		6,00		1,30	0,25	1,95
			2,00		2,10	0,53	2,21
	Muro salão		2,00		2,10	1,05	4,41
					2,10	3,17	6,66
	Parede externa salão				2,98	1,73	5,16
	Quintal				5,76	2,16	12,44

Hérllon Adamylls Mariano Ramos
 Secretário de Infraestrutura, Meio Ambiente e Projetos Especiais
 Matrícula: 7696

Página 3 de 5

ERISTON HUGO GOMES DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE Nº 06198891-2

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE
 EMPRESA CONTRATADA: M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP / CNPJ: 20.935.844/0001-31
 RESP. TÉCNICO: MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA - CREA RNP: 1821130170
 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20251303567
 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251268608
 DATA: 03/04/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
				2,08		2,03	4,22
					1,52	1,80	2,74
					0,88	2,00	1,76
	Descontos	-1,00			0,72	1,81	-1,30
		-1,00			0,65	2,05	-1,33
	Cisterna				2,20	1,35	2,97
					2,20	0,79	1,74
					2,20	0,84	1,85
	Calçada				1,44	0,83	1,20
	Pilares	4,00			0,22	0,68	0,60
		4,00			0,21	1,15	0,97
		4,00			0,21	0,95	0,80
	Reservatório	2,00	3,12			1,00	6,24
					3,08	1,00	3,08
				3,35		0,92	3,08
	CIR Salão				1,50	2,20	3,30
				1,90		0,86	1,63
				2,23		2,20	4,91
	Desconto	-1,00			0,88	2,06	-1,81
	Lateral		4,00			2,27	9,08
	Descontos	-2,00			0,60	0,78	-0,94
	Fundo galinheiro				5,35	1,57	8,40
					2,10	1,00	2,10
					1,20	1,00	1,20
	Lateral Externa			0,60		0,10	0,06
	Total item 1.7.1.1						443,12
1.7.1.2	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2					
	WC			2,14	2,09		4,47
	Coberta Frontal				5,67	1,50	8,50
	Total item 1.7.1.2						12,97
1.7.1.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2					
	Gradil entrada principal				1,85	1,98	3,66
	Basculante recepção				1,00	0,93	0,93

Hérllon Adamylls Mariano Ramos
 Secretário de Infraestrutura, Meio Ambiente e Projetos Especiais
 Matrícula: 7696

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE
 EMPRESA CONTRATADA: M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP / CNPJ: 20.935.844/0001-31
 RESP. TÉCNICO: MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA - CREA RNP: 1821130170
 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20251303567
 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20251268608
 DATA: 03/04/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
	Basculante cozinha 1				1,00	1,00	1,00
	Gradil entrada cozinha 2				1,00	2,21	2,21
	Gadil frontal salão				0,76	1,80	1,37
	Basculante CIR				0,56	0,90	0,50
	Basculante RG				0,60	0,76	0,46
	Basculante atendimento				0,60	0,77	0,46
	Total item 1.7.1.3						10,59
1.7.1.4	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2					
	Pintura: considerou os dois lados das portas (2x)						
	Porta recepção	2,00			0,72	1,81	2,61
	Porta posterior salão	2,00			0,88	2,06	3,63
	Porta RG	2,00			0,66	1,81	2,39
	Porta atendimento	2,00			0,68	1,81	2,46
	Porta dos fundos	2,00			0,72	1,81	2,61
	Porta WC	2,00			0,64	1,72	2,20
	Total item 1.7.1.4						15,90


Hérlon Adamylls Mariano Kamo
 Secretário de Infraestrutura, Meio Ambiente e Projetos Especiais
 Matrícula: 7696


 ERISTHON HUGO GOMES DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE Nº 067898891-2


 M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP
 MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA
 DIRETOR / RESP TÉCNICO
 TEC EM EDIFICAÇÕES
 ENG. CIVIL
 CREA PE 1821130170

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA BM01

OBRA: OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE

DATA:03/04/2025



FOTO 1: PLACA DE OBRA



FOTO 2: PINTURA EXTERNA



FOTO 3: PINTURA EXTERNA



FOTO 4: PINTURA EXTERNA



FOTO 5: PINTURA EXTERNA



FOTO 6: PINTURA EXTERNA

Hérllon Adamyllis Marinho Kumo
Secretário de Infraestrutura, Meio Ambiente e Projetos Especiais
Matrícula: 7896

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA BM01

OBRA: OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE

DATA: 03/04/2025



FOTO 7: PINTURA EXTERNA



FOTO 8: PINTURA EXTERNA



FOTO 9: PINTURA EXTERNA



FOTO 10: PINTURA EXTERNA



FOTO 11: PINTURA SALÃO

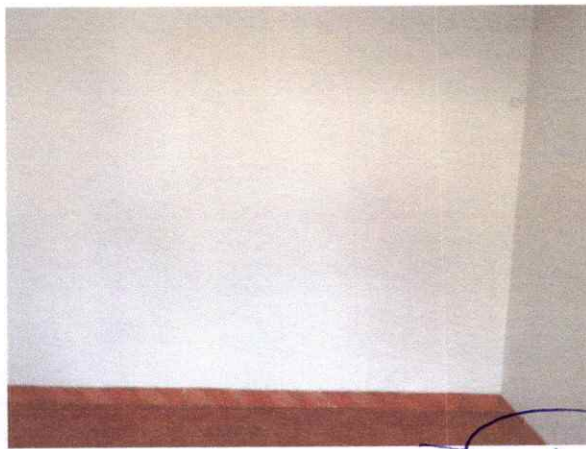


FOTO 12: PINTURA INTERNA

Hérlon Adamielis Mariano Ramos
Secretário de Infraestrutura, Meio Ambiente e Projetos Especiais
Matrícula: 7898

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA BM01

OBRA: OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE

DATA: 03/04/2025



FOTO 13: PINTURA INTERNA



FOTO 14: PINTURA INTERNA

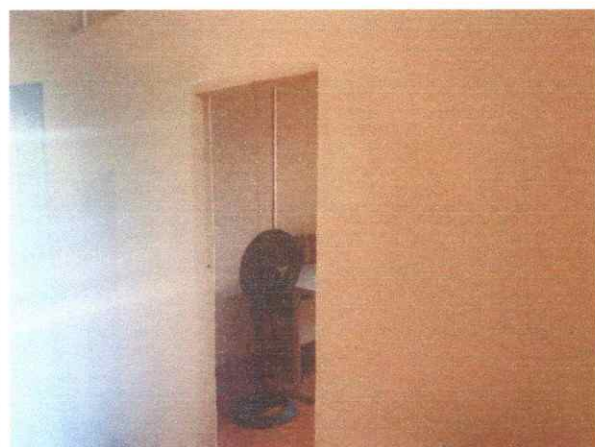


FOTO 15: PINTURA INTERNA



FOTO 16: PINTURA INTERNA

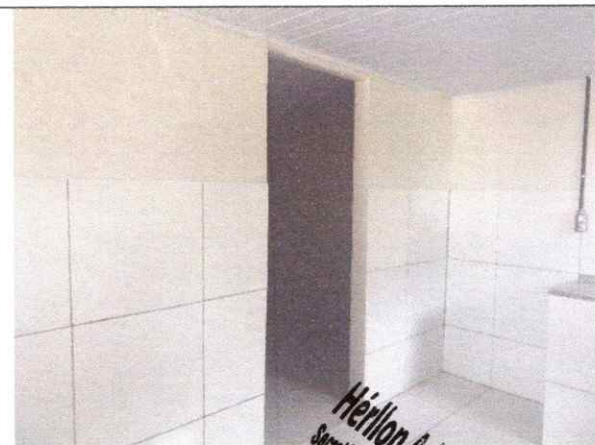


FOTO 17: PINTURA INTERNA



FOTO 18: PINTURA INTERNA

Herilson Adamyris Mariano Ramos
Secretário de Infraestrutura, Meio Ambiente e Projetos Especiais
Matrícula: 7692

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA BM01

OBRA: OBRA: PINTURA DE DIVERSOS PRÉDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS - JOÃO ALFREDO / PE

DATA: 03/04/2025



FOTO 19: PINTURA INTERNA



FOTO 20: PINTURA EM MADEIRA



FOTO 21: PINTURA EM METAL



FOTO 22: PINTURA DE TETO


Hérlon Adamyis Mariano
Secretário de Infraestrutura, Meio Ambiente e Projetos Especiais
Matrícula: 7696


ERISTON HUGO GOMES DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-CE Nº 061898891-2


M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP
MARCIANO BARBOSA DE LIRA SILVA
DIRETOR / RESP TÉCNICO
TÉC EM EDIFICAÇÕES
ENG CIVIL
CREA PE 1821130170

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OROBÓ****SECRETARIA DA FAZENDA****NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

Av. Gov. Estácio Coimbra N° 19 - Centro, CEP 55745-000 - Orobó - PE TEL.: (81)3656-1156 CNPJ: 10.294.254/0001-13



Número da Nota:

00000557

Competência:

ABR/2025

Data e Hora Emissão:

09/04/2025 09:20:54

Código de Verificação:

JD7T-8XZXU**INFORMAÇÕES FISCAIS**

Exigibilidade do ISS:

EXIGÍVEL

Regime de Tributação:

NORMAL

Município de Incidência do ISS:

JOÃO ALFREDO - PE

Local da Prestação:

JOÃO ALFREDO - PE

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Emissão do RPS:

ISS Retido:

SIM**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

20.935.844/0001-31

Inscrição Municipal:

2000242

Nome/Razão Social:

M LIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- EPP

Endereço:

STO LAUREANO, ZONA RURAL - OROBÓ. SN

Município:

OROBÓUF: **PE**

CEP:

55745000

E-mail:

marcianolira@hotmail.com

TEL:

8136561110**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ:

07.661.772/0001-13

Inscrição Municipal:

Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social:

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL DE JOÃO ALFREDO

Endereço:

RUA SEVERINO ADRIANO GOMES, N38, 38 BOA VISTA

Município:

JOÃO ALFREDOUF: **PE**

CEP:

55720000

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1. PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL #QTD: 1 - V.UND.: R\$10.278,01 - TOTAL: R\$10.278,01 - DED.: R\$6.166,81

SERVICOS DE PINTURA DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE JOAO ALFREDO/PE, COFORME BOLETIM DE MEDICAO N 01.

MAO DE OBRA 40% - R\$ 4.111,20

MATERIAL 60% - 6.166,81

RETENCAO DE IMPOSTOS:

ISS - 5% SOBRE O VALOR DA MAO DE OBRA - R\$ 205,56

INSS - 11% SOBRE O VALOR DA MAO DE OBRA - R\$ 452,23

IRPJ - 1,2% SOBRE O TOTAL DA NOTA - R\$ 123,34

DADOS BANCARIOS:

BANCO DO BRASIL

AG: 2369-6

CC: 19.391-7

Hérllon Adamylls Mariano Ramos
Secretário de Infraestrutura, Meio Ambiente e Projetos Especiais
Matrícula: 7696

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.278,01

Atividade Prestada:

Código CNAE:

500382 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
9.496,88	6.166,81	4.111,20	5,00%	205,56
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	452,23	0,00	0,00	123,34
Outras Retenções (R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.

- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.

- O ISS desta NFS-e é devido FORA deste Município.

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-orobo/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

126655502181

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-orobo/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da Nota
