

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: 1ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DO GINÁSIO DJAIR LOCALIZAÇÃO: RUA JOSÉ FRANCISCO DE BARROS - JOÃO ALFREDO / PE EMPRESA CONTRATADA: IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE RESP. TÉCNICO: IRLYS CAVALCANTI BRAYNER - RNP: 1603425187 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20231016513 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20230949943	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 010/2023 - PMJA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 001/2023 - PMJA CONTRATO Nº: 050/2023 - PMJA VALOR DO CONTRATO: R\$ 542.565,04 DATA DA 4ª REPROGRAMAÇÃO: 01/07/2024 4ª ADITIVO DE VALOR: R\$ 32.301,40 (5,95%)	ORDEM DE SERVIÇO: 13/07/2023 PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 371 DIAS PRAZO RESTANTE: 109 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 13/03/2024 + 120 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2024 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 113.433,89 VALOR ACUMULADO: R\$ 392.713,96 % ACUMULADO: 64,46% PERÍODO: 02/05/2024 A 18/07/2024 DATA DE ELABORAÇÃO: 18/07/2024
---	---	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	4ª PLANILHA REPROGRAMADA		5ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 5ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				12.581,58		2.013,05		8.052,19		4.529,39
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	12.581,58	1,00	12.581,58	0,16	2.013,05	0,64	8.052,19	0,36	4.529,39
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				13.127,25		5.484,35		12.588,75		538,50
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, INSTALADA	M2	376,33	4,50	1.693,48	-	-	4,50	1.693,48	-	-
1.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF 11/2019	M2	0,13	4.142,32	538,50	-	-	-	-	4.142,32	538,50
1.3	INSTALAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA SEM FORNECIMENTO DO MATERIAL (APENAS MÃO DE OBRA) (FONTE: SINAPI COMPOSIÇÃO 11, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	M2	17,77	299,53	5.322,64	-	-	299,53	5.322,64	-	-
1.4	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 (FONTE: SINAPI 97631, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	M2	3,04	29,04	88,28	-	-	29,04	88,28	-	-
1.5	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF 05/2018 (FONTE: SINAPI 98526, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	UN	84,27	10,00	842,70	10,00	842,70	10,00	842,70	-	-
1.6	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF 05/2018 (FONTE: SINAPI 98524, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	M2	3,04	418,57	1.272,45	418,57	1.272,45	418,57	1.272,45	-	-
1.7	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 (FONTE: SINAPI 97639, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	M2	18,31	6,72	123,04	6,72	123,04	6,72	123,04	-	-
1.8	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO (FONTE: SINAPI COMPOSIÇÃO 12, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	M	6,02	124,31	748,34	124,31	748,34	124,31	748,34	-	-
1.9	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO SEM REAPROVEITAMENTO (FONTE: SINAPI COMPOSIÇÃO 13, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	M2	12,05	201,08	2.423,01	201,08	2.423,01	201,08	2.423,01	-	-
1.10	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 (FONTE: SINAPI 97622, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	M3	52,32	1,43	74,81	1,43	74,81	1,43	74,81	-	-
2.0	TRABALHOS EM TERRA				31.945,00		4.320,42		9.373,18		22.571,82

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: 1ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DO GINÁSIO DJAIR LOCALIZAÇÃO: RUA JOSÉ FRANCISCO DE BARROS - JOÃO ALFREDO / PE EMPRESA CONTRATADA: IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE RESP. TÉCNICO: IRLYS CAVALCANTI BRAYNER - RNP: 1603425187 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20231016513 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20230949943	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 010/2023 - PMJA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 001/2023 - PMJA CONTRATO Nº: 050/2023 - PMJA VALOR DO CONTRATO: R\$ 542.565,04 DATA DA 4ª REPROGRAMAÇÃO: 01/07/2024 4ª ADITIVO DE VALOR: R\$ 32.301,40 (5,95%)	ORDEM DE SERVIÇO: 13/07/2023 PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 371 DIAS PRAZO RESTANTE: 109 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 13/03/2024 + 120 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2024 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 113.433,89 VALOR ACUMULADO: R\$ 392.713,96 % ACUMULADO: 64,46% PERÍODO: 02/05/2024 A 18/07/2024 DATA DE ELABORAÇÃO: 18/07/2024
---	---	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	4ª PLANILHA REPROGRAMADA		5ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 5ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	90,90	30,86	2.805,17	14,00	1.272,60	30,86	2.805,17	-	-
2.2	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	55,12	2,35	129,53	-	-	2,35	129,53	-	-
2.3	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	53,82	414,23	22.293,85	56,63	3.047,82	119,63	6.438,48	294,60	15.855,37
2.4	ENCHIMENTO DE AREIA FINA, LANÇAMENTO MANUAL	M3	160,03	41,97	6.716,45	-	-	-	-	41,97	6.716,45
3.0	INFRAESTRUTURA				35.439,03		10.946,06		35.439,03		-
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M3	629,94	5,08	3.200,08	2,14	1.348,07	5,08	3.200,08	-	-
3.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL, JUNTAS DE 1 CM	M2	85,27	237,69	20.267,81	112,56	9.597,99	237,69	20.267,81	-	-
3.3	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2023 (FONTE: SINAPI 104488, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	M3	2.536,26	4,72	11.971,14	-	-	4,72	11.971,14	-	-
4.0	PAREDES E REVESTIMENTOS				15.753,20		11.369,64		15.753,20		-
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	4,54	329,29	1.494,96	237,66	1.078,97	329,29	1.494,96	-	-
4.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	43,30	329,29	14.258,24	237,66	10.290,67	329,29	14.258,24	-	-
5.0	PISOS				373.758,94		45.772,61		257.602,85		116.156,09


 Cláudio César Araújo Santana
 Engenheiro Civil
 CREA nº 1820795489 PE


 ERISTHON HUGO GOMES DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE Nº 061898891-2

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: 1ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DO GINÁSIO DJAIR LOCALIZAÇÃO: RUA JOSÉ FRANCISCO DE BARROS - JOÃO ALFREDO / PE EMPRESA CONTRATADA: IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE RESP. TÉCNICO: IRLYS CAVALCANTI BRAYNER - RNP: 1603425187 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20231016513 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20230949943	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 010/2023 - PMJA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 001/2023 - PMJA CONTRATO Nº: 050/2023 - PMJA VALOR DO CONTRATO: R\$ 542.565,04 DATA DA 4ª REPROGRAMAÇÃO: 01/07/2024 4ª ADITIVO DE VALOR: R\$ 32.301,40 (5,95%)	ORDEN DE SERVIÇO: 13/07/2023 PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 371 DIAS PRAZO RESTANTE: 109 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 13/03/2024 + 120 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2024 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 113.433,89 VALOR ACUMULADO: R\$ 392.713,96 % ACUMULADO: 64,46% PERÍODO: 02/05/2024 A 18/07/2024 DATA DE ELABORAÇÃO: 18/07/2024
---	---	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	4ª PLANILHA REPROGRAMADA		5ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 5ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
5.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016	M	52,03	1.182,98	61.550,44	18,22	947,98	1.025,56	53.359,86	157,42	8.190,58
5.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	70,21	361,54	25.383,72	123,95	8.702,52	340,05	23.874,89	21,49	1.508,83
5.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	M2	76,20	1.302,05	99.216,21	286,45	21.827,49	714,76	54.464,70	587,29	44.751,51
5.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	M2	69,56	1.243,16	86.474,20	86,59	6.023,20	602,15	41.885,54	641,01	44.588,66
5.5	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF 04/2022	M2	3,71	742,62	2.755,12	-	-	723,49	2.684,13	19,13	70,99
5.6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, MALHA 10X10CM, FERRO 4.2 MM (2,20 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	35,10	742,62	26.065,96	-	-	723,49	25.394,49	19,13	671,47
5.7	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF 09/2020	M2	74,16	742,62	55.072,69	-	-	642,77	47.667,82	99,85	7.404,87
5.8	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF 05/2018	M2	4,13	281,05	1.160,73	38,89	160,61	38,89	160,61	242,16	1.000,12
5.9	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF 05/2018	M2	14,78	403,75	5.967,42	403,75	5.967,42	403,75	5.967,42	-	-
5.10	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF 05/2018	UN	215,38	37,00	7.969,06	-	-	-	-	37,00	7.969,06
5.11	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018 (FONTE: SINAPI 98510, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	UN	112,81	19,00	2.143,39	19,00	2.143,39	19,00	2.143,39	-	-
6.0	PINTURAS E ACABAMENTOS				9.697,44		-		-		9.697,44
6.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	2,93	131,67	385,79	-	-	-	-	131,67	385,79

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: 1ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DO GINÁSIO DJAIR LOCALIZAÇÃO: RUA JOSÉ FRANCISCO DE BARROS - JOÃO ALFREDO / PE EMPRESA CONTRATADA: IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE RESP. TÉCNICO: IRLYS CAVALCANTI BRAYNER - RNP: 1603425187 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20231016513 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20230949943	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 010/2023 - PMJA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 001/2023 - PMJA CONTRATO Nº: 050/2023 - PMJA VALOR DO CONTRATO: R\$ 542.565,04 DATA DA 4ª REPROGRAMAÇÃO: 01/07/2024 4ª ADITIVO DE VALOR: R\$ 32.301,40 (5,95%)	ORDEM DE SERVIÇO: 13/07/2023 PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 371 DIAS PRAZO RESTANTE: 109 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 13/03/2024 + 120 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2024 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 113.433,89 VALOR ACUMULADO: R\$ 392.713,96 % ACUMULADO: 64,46% PERÍODO: 02/05/2024 A 18/07/2024 DATA DE ELABORAÇÃO: 18/07/2024
---	---	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	4ª PLANILHA REPROGRAMADA		5ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 5ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
6.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	11,33	131,67	1.491,82	-	-	-	-	131,67	1.491,82
6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	15,86	131,67	2.088,28	-	-	-	-	131,67	2.088,28
6.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	19,94	287,44	5.731,55	-	-	-	-	287,44	5.731,55
7.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA				78.297,94		14.913,46		35.290,46		43.007,48
7.1	POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 8 M, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	890,77	1,00	890,77	1,00	890,77	1,00	890,77	-	-
7.2	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	99,01	1,00	99,01	1,00	99,01	1,00	99,01	-	-
7.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	27,68	1,00	27,68	-	-	-	-	1,00	27,68
7.4	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	28,57	1,00	28,57	-	-	-	-	1,00	28,57
7.5	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	13,93	525,68	7.322,72	-	-	-	-	525,68	7.322,72
7.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6,60	124,00	818,40	-	-	-	-	124,00	818,40
7.7	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	112,63	39,00	4.392,57	-	-	8,00	901,04	31,00	3.491,53
7.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	8,69	1.577,04	13.704,47	-	-	-	-	1.577,04	13.704,47
7.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4,07	372,00	1.514,04	-	-	-	-	372,00	1.514,04

5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: 1ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DO GINÁSIO DJAIR LOCALIZAÇÃO: RUA JOSÉ FRANCISCO DE BARROS - JOÃO ALFREDO / PE EMPRESA CONTRATADA: IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE RESP. TÉCNICO: IRLYS CAVALCANTI BRAYNER - RNP: 1603425187 ART DE EXECUÇÃO Nº PE20231016513 ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20230949943	PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 010/2023 - PMJA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 001/2023 - PMJA CONTRATO Nº: 050/2023 - PMJA VALOR DO CONTRATO: R\$ 542.565,04 DATA DA 4ª REPROGRAMAÇÃO: 01/07/2024 4ª ADITIVO DE VALOR: R\$ 32.301,40 (5,95%)	ORDEN DE SERVIÇO: 13/07/2023 PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES PRAZO TRANSCORRIDO: 371 DIAS PRAZO RESTANTE: 109 DIAS ADITIVO DE PRAZO: 13/03/2024 + 120 DIAS	BOLETIM DE MEDIÇÃO: 004/2024 VALOR TOTAL DO BM: R\$ 113.433,89 VALOR ACUMULADO: R\$ 392.713,96 % ACUMULADO: 64,46% PERÍODO: 02/05/2024 A 18/07/2024 DATA DE ELABORAÇÃO: 18/07/2024
---	---	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO	4ª PLANILHA REPROGRAMADA		5ª MEDIÇÃO		ACUMULADO ATÉ 5ª MEDIÇÃO		SALDO	
				QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL	QUANT.	V. TOTAL
7.10	POSTE DECORATIVO 2 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO, COM 4M, INCLUSIVE 2 LUMINÁRIA DE LED 50W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1.391,14	16,00	22.258,24	-	-	14,00	19.475,96	2,00	2.782,28
7.11	POSTE DECORATIVO 2 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO TUBULAR, H = *2,5* M, COM SUPORTE E LUMINÁRIAS GLOBO LEITOSO (48CM) EM POLIETILENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1.035,89	20,00	20.717,80	13,30	13.777,33	13,30	13.777,33	6,70	6.940,47
7.12	LUMINÁRIA DE PISO LED 10W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	277,18	4,00	1.108,72	-	-	-	-	4,00	1.108,72
7.13	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	146,35	37,00	5.414,95	1,00	146,35	1,00	146,35	36,00	5.268,60
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				38.616,62		18.614,30		18.614,30		20.002,32
8.1	CONJUNTO DE MESA DE CONCRETO COM TAMPO REVESTIDO COM CERÂMICA E 04 (QUATRO) BANCOS EM CONCRETO, PADRÃO SECID/PE, CONFORME PROJETO	UN	1.127,03	6,00	6.762,18	6,00	6.762,18	6,00	6.762,18	-	-
8.2	CONSTRUÇÃO DE BANCO MURETA EM CONCRETO ARMADO, APOIADO EM ALVENARIA DE 1 VEZ CHAPISCADA E REVESTIDA, SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E REMOCAO. (MOD. AV-27/2000 OPCAO 02).	M	289,48	101,65	29.425,64	33,60	9.726,52	33,60	9.726,52	68,05	19.699,12
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04 (FONTE: ORSE 04440, JAN/2023)	M2	52,64	46,14	2.428,80	40,38	2.125,60	40,38	2.125,60	5,76	303,20
CENTO E TREZE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS					609.217,00		113.433,89		392.713,96		216.503,04


ERISTON HUGO GOMES DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE Nº 061898891-2


Cláudio César Araújo Brito
 Engenheiro Civil
 CREA nº 1820795488 PE

Secretário de Serviços públicos

Responsável Técnico pela Medição

Responsável Técnico Contratada

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: 1ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DO GINÁSIO DJAIR SANTOS
 LOCALIZAÇÃO: RUA JOSÉ FRANCISCO DE BARROS - JOÃO ALFREDO / PE
 EMPRESA CONTRATADA: IHNNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI
 RESP. TÉCNICO: IRLYS CAVALCANTI BRAYNER - RNP: 1603425187
 DATA: 18/07/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
I.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
I.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	<i>Evolução %</i>	<i>Total</i>			
	Percentual de evolução da obra		64,13%	1,00			0,64
	Total item I.1						0,64
	Medido acumulado						0,48
	Medir neste BM						0,16
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.5	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 (FONTE: SINAPI 98526, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	UN					
	Tronco de árvore (Muro de pedra)		10,00				10,00
	Total item 1.5						10,00
1.6	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (FONTE: SINAPI 98524, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	M2				<i>HMD</i>	
	Limpeza de vegetação no talude			20,00		6,19	123,75
				20,00		5,70	114,00
				5,00		6,35	31,75
				7,00		5,40	37,80
				6,00		3,80	22,80
				9,00		1,90	17,10
	Trecho LD			15,77	2,47		38,90
				10,70	1,59		16,99
				9,80	1,58		15,48
	Total item 1.6						418,57
1.7	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (FONTE: SINAPI 97639, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	M2					
	Remoção de bancos de concreto (Muro de pedra)		12,00	1,40	0,40		6,72
	Total item 1.7						6,72
1.8	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO (FONTE: SINAPI COMPOSIÇÃO 12, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	M					
	Remoção de meio de pedra (Muro de pedra)			124,31			124,31
	Total item 1.8						124,31
1.9	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO SEM REAPROVEITAMENTO (FONTE: SINAPI COMPOSIÇÃO 13, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	M2				<i>LMD</i>	
	Remoção de pavimentação em intertravados (Muro de pedra)			4,15	2,72		11,29
				6,30			6,30
				10,00	1,65		16,45
				10,00	1,57		15,65
				10,00	1,59		15,90
				10,00	1,60		15,95
				10,00	1,57		15,70
				10,00	1,42		14,15
				10,00	1,32		13,15
				10,00	1,50		14,95
				10,00	2,07		20,70
				10,00	3,03		30,25
				6,16	3,68		22,64
	Descontos dos Canteiros		-12,00	1,00	1,00		-12,00
	Total item 1.9						201,08

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: 1ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DO GINÁSIO DJAIR SANTOS
 LOCALIZAÇÃO: RUA JOSÉ FRANCISCO DE BARROS - JOÃO ALFREDO / PE
 EMPRESA CONTRATADA: IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI
 RESP. TÉCNICO: IRLYS CAVALCANTI BRAYNER - RNP: 1603425187
 DATA: 18/07/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
1.10	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (FONTE: SINAPI 97622, MAR/2023 SEM DESONERAÇÃO)	M3					
	Base praça antiga LD			7,67	0,12	0,30	0,28
				10,90	0,12	0,30	0,39
				11,00	0,12	0,30	0,40
				9,90	0,12	0,30	0,36
	Total item 1.10						1,43
2.0	TRABALHOS EM TERRA						
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3		Vol.			
	Área de vôlei			9,05	0,30	0,55	1,49
				9,05	0,30	0,65	1,76
				17,57	0,30	0,65	3,43
				17,57	0,30	0,55	2,90
	Base dos quiosques		4,00	4,06	0,30	0,25	1,22
			4,00	2,96	0,30	0,25	0,89
			4,00	2,55	0,30	0,25	0,77
			4,00	3,19	0,30	0,25	0,96
			Passaieo LE		38,67	0,30	0,05
	Total item 2.1						14,00
2.3	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF 05/2016	M3					
	Área de vôlei			17,57	9,05	0,30	47,70
	Área dos quiosques			2,92	2,74	0,15	1,20
				38,67	0,80	0,25	7,73
	Total item 2.3						56,63
3.0	INFRAESTRUTURA						
3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF 08/2017	M3					
	Área de vôlei			9,05	0,30	0,05	0,14
				9,05	0,30	0,05	0,14
				17,57	0,30	0,05	0,26
				17,57	0,30	0,05	0,26
	Base dos quiosques		4,00	4,06	0,30	0,05	0,24
			4,00	2,96	0,30	0,05	0,18
			4,00	2,55	0,30	0,05	0,15
			4,00	3,19	0,30	0,05	0,19
			Passaieo LE		38,67	0,30	0,05
	Total item 3.1						2,14
3.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL, JUNTAS DE 1 CM	M2					
	Área de vôlei			9,05		1,00	9,05
				9,05		1,00	9,05
				17,57		1,00	17,57
				17,57		1,00	17,57
	Base dos quiosques		4,00	4,06		0,30	4,87
			4,00	2,96		0,30	3,55
			4,00	2,55		0,30	3,06
			4,00	3,19		0,30	3,83
			Passaieo LE		38,67		0,70
	Complemento Frontal		14,09		0,17	2,35	

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: 1ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DO GINÁSIO DJAIR SANTOS
 LOCALIZAÇÃO: RUA JOSÉ FRANCISCO DE BARROS - JOÃO ALFREDO / PE
 EMPRESA CONTRATADA: IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI
 RESP. TÉCNICO: IRLYS CAVALCANTI BRAYNER - RNP: 1603425187
 DATA: 18/07/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
				7,45		0,59	4,36
	Acima do talude			85,25		0,12	10,23
	Total item 3.2						112,56
4.0	PAREDES E REVESTIMENTOS						
4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2					
	BM 04 não foi medido						
	Parte posterior		2,00	10,00		0,19	3,70
			2,00	10,00		0,24	4,70
			2,00	10,00		0,23	4,50
			2,00	5,55		0,20	2,22
			2,00	7,50		0,35	5,25
	Capiaço			43,05	0,16		6,89
	Área dos animais			9,04		0,31	2,80
				9,12		0,34	3,10
				3,03		0,45	1,36
				3,16		0,28	0,88
	Área de jogos			4,30		0,20	0,86
				4,30		0,45	1,94
				12,07		0,25	2,96
				12,07		0,24	2,84
	Parte LE			21,94		0,25	5,49
				6,65		0,30	2,00
				17,55		0,30	5,27
	Capiaço			46,14	0,20		9,23
	Área de vôlei		2,00	9,05		0,50	9,05
			2,00	9,05		0,40	7,24
			2,00	17,57		0,40	14,06
			2,00	17,57		0,50	17,57
	Capiaço			53,24	0,20		10,65
	Base dos quiosques		8,00	4,06		0,20	6,50
			8,00	2,96		0,20	4,74
			8,00	2,55		0,20	4,08
			8,00	3,19		0,20	5,10
	Capiaço		4,00	12,76	0,20		10,21
	Passeio LE			38,67		0,70	27,07
	Capiaço			38,67	0,20		7,73
	Complemento Frontal			14,09		0,17	2,35
				7,45		0,59	4,36
	Capiaço			21,54	0,16		3,45
	Acima do talude	2,00		85,25		0,12	20,46
	Capiaço			85,25	0,20		17,05
	Total item 4.1						237,66
4.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2			Área		
	Item 4.1			237,66			237,66
	Total item 4.2						237,66
5.0	PISOS						

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: 1ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DO GINÁSIO DJAIR SANTOS
LOCALIZAÇÃO: RUA JOSÉ FRANCISCO DE BARROS - JOÃO ALFREDO / PE
EMPRESA CONTRATADA: IHN OVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI
RESP. TÉCNICO: IRLYS CAVALCANTI BRAYNER - RNP: 1603425187
DATA: 18/07/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL	
5.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016	M						
	Lateral LE Arco					18,22	18,22	
	Total item 5.1						18,22	
5.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M						
	MF - Externo / LD e Frontal / talude					123,95	123,95	
	Total item 5.2						123,95	
5.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	M2		Área				
	Paver (Amarelo)					0,82	0,82	
							2,14	2,14
							3,00	3,00
							3,63	3,63
							4,25	4,25
							4,87	4,87
							5,42	5,42
							5,90	5,90
							11,34	11,34
							10,02	10,02
							9,52	9,52
							9,52	9,52
							9,85	9,85
							10,37	10,37
							11,30	11,30
							5,75	5,75
							5,37	5,37
							5,02	5,02
							4,58	4,58
							4,11	4,11
							3,58	3,58
							3,51	3,51
							2,15	2,15
							7,16	7,16
							4,35	4,35
			Quiosques				13,10	4,59
					2,90	1,07	3,10	
					1,06	1,58	1,67	
					1,45	1,07	1,55	
	Paver (Vermelho)							
	Arco posterior (Metade)				32,90	1,80	59,22	
	Área (Circulo LD)				13,21		13,21	
	Total item 5.3						286,45	
5.4	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	M2				LMD		
	Paver (Natural)							
	Passeios Quiosques				38,67	0,80		30,94
	Passeios parte LD				17,40	3,22		56,09
	Descontos			-2,00	0,40	0,40		-0,32
				-1,00	0,40	0,30		-0,12
	Total item 5.4							86,59
5.8	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2		Área				

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: 1ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DO GINÁSIO DJAIR SANTOS
 LOCALIZAÇÃO: RUA JOSÉ FRANCISCO DE BARROS - JOÃO ALFREDO / PE
 EMPRESA CONTRATADA: IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI
 RESP. TÉCNICO: IRLYS CAVALCANTI BRAYNER - RNP: 1603425187
 DATA: 18/07/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
	Área Verde (Jardim)						
	1º Canteiro			8,04			8,04
				7,59			7,59
				8,44			8,44
				8,92			8,92
				5,90			5,90
	Total item 5.8						38,89
5.9	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2					
	Área Verde (Jardim)						
	1º Canteiro			8,04			8,04
				7,59			7,59
				8,44			8,44
				8,92			8,92
				5,90			5,90
	2º Canteiro			10,70	3,77		40,30
	3º Canteiro (Quiosques)	2,00		8,00			16,00
	4º Canteiro (Talude)			20,00	6,19		123,75
				20,00	5,70		114,00
				5,00	6,35		31,75
				7,00	5,40		37,80
				6,00	3,80		22,80
				9,00	1,90		17,10
	Descontos (Rochas)		-1,00	4,65	1,43		-6,67
			-1,00	2,40	1,55		-3,72
			-1,00	2,40	1,23		-2,95
			-1,00	1,40	1,00		-1,40
			-1,00	1,60	0,68		-1,09
			-1,00	2,30	0,55		-1,27
			-1,00	5,30	2,00		-10,61
			-1,00	4,30	1,16		-4,97
			-1,00	5,55	1,07		-5,96
	Total item 5.9						403,75
5.11	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 (FONTE: SINAPI 104488, MAR/2022 SEM DESONERAÇÃO)	UN					
	Área Verde (Jardim)		19,00				19,00
	Total item 5.11						19,00
7.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						
7.1	POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 8 M, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN					
	Assentamento de Poste de concreto - Entrada de energia		1,00				1,00
	Total item 7.1						1,00
7.2	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN					
	Quadro de medição		1,00				1,00
	Total item 7.2						1,00
7.11	POSTE DECORATIVO 2 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO TUBULAR, H = *2,5* M, COM SUPORTE E LUMINÁRIAS GLOBO LEITOSO (48CM) EM POLIETILENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN					
	Nº Postes (Postes sem luminária e com globo leitoso divergente do contratado)		70%	19,00			13,30
	Total item 7.11						13,30
7.13	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN					

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO
5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: 1ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DO GINÁSIO DJAIR SANTOS
 LOCALIZAÇÃO: RUA JOSÉ FRANCISCO DE BARROS - JOÃO ALFREDO / PE
 EMPRESA CONTRATADA: IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI
 RESP. TÉCNICO: IRLYS CAVALCANTI BRAYNER - RNP: 1603425187
 DATA: 18/07/2024

ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	TAXA	COMP.	LARG.	ALTURA	TOTAL
	Entrada de energia		1,00				1,00
	Total item 7.13						1,00
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
8.1	CONJUNTO DE MESA DE CONCRETO COM TAMPO REVESTIDO COM CERÂMICA E 04 (QUATRO) BANCOS EM CONCRETO, PADRÃO SECID/PE, CONFORME PROJETO	UN		Conf. Projeto			
	Área da Praça		6,00				6,00
	Total item 8.1						6,00
8.2	CONSTRUCAO DE BANCO MURETA EM CONCRETO ARMADO, APOIADO EM ALVENARIA DE 1 VEZ CHAPISCADA E REVESTIDA, SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E REMOCAO. (MOD.AV-27/2000 OPCA0 02).	M					
	Área da Praça - LE		4,00	4,20			16,80
	Área da Praça - LD		4,00	4,20			16,80
	Total item 8.2						33,60
8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04 (FONTE: ORSE 04440, JAN/2023)	M					
	Área da Praça - LE/LD		7,00	4,20	0,42		12,35
			14,00	4,20		0,35	20,58
			14,00		0,20	0,35	0,98
			14,00	4,20		0,10	5,88
			14,00	0,42		0,10	0,59
	Total item 8.3						40,38

Erithon Hugo G. da Silva
 ERISTHON HUGO GOMES DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-CE Nº 061898891-2

Cláudio César Almeida Santana
 Cláudio César Almeida Santana
 Engenheiro Civil
 CREA nº 1820795489 PE

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: 1ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DO GINÁSIO DJAIR NO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - PE.

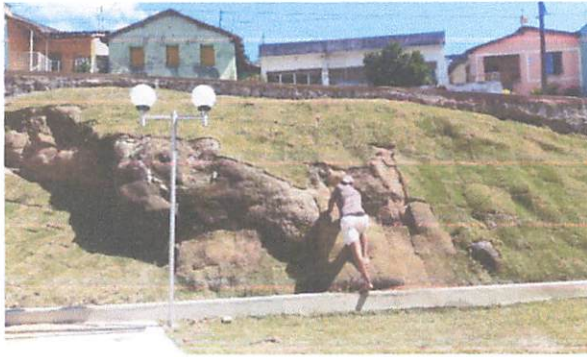


FOTO 1: Plantio de grama



FOTO 2: Plantio de grama



FOTO 3: Revestimento cerâmico dos bancos



FOTO 4: Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular amarelo



FOTO 5: Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular amarelo e vermelho



FOTO 6: Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular amarelo

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: 1ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DO GINÁSIO DJAIR NO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - PE.



FOTO 7: Assentamento de guia meio-fio



FOTO 8: Assentamento de guia meio-fio e execução de passeio em piso intertravado de cor natural



FOTO 9: Assentamento de guia meio fio e alvenaria de 1 vez



FOTO 10: Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular amarelo



FOTO 11: Plantio de muda



FOTO 12: Plantio de muda

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA DO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO

OBRA: 1ª ETAPA DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA ENTORNO DO GINÁSIO DJAIR NO MUNICÍPIO DE JOÃO ALFREDO - PE.



FOTO 13: Execução de passeio em piso intertravado de cor natural



FOTO 14: Assentamento de guia meio-fio



FOTO 15: Assentamento de guia meio fio e alvenaria de 1 vez



FOTO 16: Assentamento de guia meio fio e alvenaria de 1 vez



FOTO 17: Caixa elétrica aterrada



FOTO 18: Caixa elétrica aterrada

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM**

Secretaria da Fazenda

NFS-e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PRACA 19 DE JULHO N° s/n - Centro, CEP 55730-000 - Bom Jardim - PE TEL.: (81)3638-1156 CNPJ: 10.293.074/0001-17



Número da Nota:

00000245

Competência:

JUL/2024

Data e Hora Emissão:

22/07/2024 08:21:51

Código de Verificação:

S4X8-CN7P3

INFORMAÇÕES FISCAIS

Exigibilidade do ISS: **ISENÇÃO** Regime de Tributação: **SIMPLES NACIONAL** Município de Incidência do ISS: **BOM JARDIM - PE** Local da Prestação: **BOM JARDIM - PE**
Número do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão do RPS: ISS Retido: **SIM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **31.506.321/0001-96** Inscrição Municipal: **1279**
Nome/Razão Social: **IHNOVE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI**
Endereço: **AÇUDES ,ZONA RURAL. 11 PR**
Município: **BOM JARDIM** UF: **PE** CEP: **55730000**
E-mail: TEL: **(81)9974-6343**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.097.359/0001-45** Inscrição Municipal: **---** Inscrição Estadual: **---**
Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO ALFREDO**
Endereço: **AV 13 DE MAIO, 45 BOA VISTA**
Município: **JOÃO ALFREDO** UF: **PE** CEP: **55720000**
E-mail:

CONSTRUÇÃO CIVIL

Informações: **dados bancarios banco santander**
AG 4010 C/C 13001086-6

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1.1 ETAPA DA REVITALIZACAO DA PRACA ENTORNO DO GINASIO DJAIR SANTOS #QTD:1 - V.UND.:R\$113.433,89 - TOTAL.:R\$113.433,89

1 ETAPA DA REVITALIZACAO DA PRACA ENTORNO DO GINASIO DJAIR SANTOS
REFERENTE AO 5 BOLETIM DE MEDICAO
MATERIAL 40% 45.373,55
MAO DE OBRA 60% 68.060,34
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 113.433,89

Atividade Prestada:

4399101 - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

Código CNAE:

702 - 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
113.433,89	0,00	113.433,89	0,00%	0,00
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

OUTRAS INFORMAÇÕES5

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- Os serviços referentes a esta NFS-e são isentos/Imunes.
- Optante pelo Simples Nacional.

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-bomjardim/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade>

13513955472027

<https://www.tributosmunicipais.com.br/NFE-bomjardim/notaFiscalAction.do?operacao=verificarAutenticidade> acesse o site para verificar a autenticidade da
